



Borgarráð

Viti við Sæbraut - Tilvísun í mál R18100135.

Á fundi borgarráðs þann 4. október 2018 var lögð fram svohljóðandi fyrirspurn frá áheyrnarfulltrúa Miðflokksins:

1. Hver er heildarkostnaður Faxaflóahafna í verkefninu viti við Sæbraut?
2. Hver er heildarkostnaður Reykjavíkurborgar í verkefninu?
3. Hvaða hluti verkefnisins er greitt af Faxaflóahöfnum?
4. Hvaða hluti verkefnisins er greiddur af Reykjavíkurborg?
5. Var verkið boðið út samkvæmt innkaupareglum Reykjavíkurborgar og lögum um opinber fjármál?
6. Hefur verkefnið dregist miðað við upphaflegan tíma um verklok?
7. Hvenær eru áætluð verklok?
8. Hvernig skiptist kostnaðurinn á milli Faxaflóahafna og borgarinnar í þessu verkefnum?

Á fundi borgarráðs þann 25. október 2018 var lögð fram svohljóðandi fyrirspurn frá áheyrnarfulltrúa Miðflokksins:

"Óskað er eftir öllum reikningum sem greiddir hafa verið út vegna vitans við Sundabraut."

Neðangreind eru svör umhverfis- og skipulagssviðs annars vegar og svör fjármálaskrifstofu hins vegar:

Svör umhverfis- og skipulagssviðs við fyrirspurn lögð fram 4. október 2018:

Vísað er til svara Faxaflóahafna sf. þar sem við á.

1. Sjá svar Faxaflóahafna sf.
2. Samkvæmt viðauka við fjárfestingaráætlun 2018 sem samþykktur var í borgarráði þann 16. ágúst 2018 er gert ráð fyrir að heildarkostnaður Reykjavíkurborgar vegna verkefnisins verði 150 mkr. Áður hafði verið gert ráð fyrir 100 mkr. skv.

fjárhagsáætlun.

Hækkun er tilkomin vegna hærra tilboðs en áætlun gerði ráð fyrir auk þess að umfang við landfyllingu, grjótvörnir, gerð hjáleiða o.fl. var meira en upphaflega hafði verið áætlað.

Áður hafði verið kynnt í borgarráði (25.01.2018) að kostnaður Reykjavíkurborgar í verkefninu myndi vera 75 mkr. en gert var ráð fyrir 100 mkr. vegna verkefnisins í fjárhagsáætlun ársins 2018.

3. Sjá svar Faxaflóahafna sf.
4. Reykjavíkurborg greiðir fyrir undirstöður vita, lagnavinnu, uppsteypu og frágang á útsýnispalli, lýsingu, aðlögun að núverandi stígakerfi o.fl. Þá greiðir Reykjavíkurborg fyrir þann hluta framkvæmda við landfyllingu og grjótvörn sem er umfram 25 mkr. hlut Faxaflóahafna sf.
5. Leitað var verða og samið svo beint við sérhæfðan jarðvinnuverktaka um landfyllingu, gerð grjótvörnarkápu utan á landfyllingu og gerð hjáleiða. Samningsupphæð var kr. 27.671.801 kr. sem er undir útboðsmörkum innkaupareglna Reykjavíkurborgar. Aðrar framkvæmdir voru boðnar út í opnu útboði og tilboð opnuð 30. maí 2018. Tvö tilboð bárust í verkið. Lægstbjóðandi uppfyllti ekki kröfur útboðsgagna og samið var við næst-lægstbjóðanda en tilboð hans var 14,5 % yfir kostnaðaráætlun við opnun tilboða. Samningsupphæð er 88.840.000 kr.
6. Upphaflega var gert ráð fyrir að framkvæmdum yrði lokið í júní 2018. Framkvæmdir hafa hins vegar gengið nokkuð hægar en gert var ráð fyrir. Landgerð og grjótröðun tók lengri tíma en áætlað var og nokkur töf varð á því að gengið var til samninga að undangengnu útboði í uppsteypu, frágang o.fl.
7. Stefnt er að því að Vitinn og handrið verði sett upp um miðjan desember nk. Fullnaðarfrágangur svæðisins bíður næsta vors.
8. Kostnaður Reykjavíkurborgar er eins og áður segir áætlaður 150 mkr. Faxaflóahafnir sf. greiða svo 25 mkr. vegna landfyllingar og grjótvorna auk þess að greiða Faxaflóahafnir sf. fyrir smíði vitahúss, ljós búnað o.fl.

Svör fjármálsskrifstofu við fyrirspurn lögð fram 25. október 2018:

Fjármálaskrifstofa hefur tekið saman þá reikninga sem skráðir eru í bókhald Reykjavíkurborgar á verkefnið Viti við Sæbraut og staðfestir að samkvæmt stöðu í bókhaldi Reykjavíkurborgar þann 13. nóvember 2018 hefur verið gjaldfært 96.093.264 kr. vegna verkefnisins. Þá hefur fjármálaskrifstofa yfirfarið þá reikninga sem skráðir eru á verkefnið og afmáð upplýsingar sem þar mátti finna er vörðuðu einka- eða fjárhagsmálefni einstaklinga sem sanngjarnt er og eðlilegt að leynt fari samkvæmt 9.gr. og 3.mgr. 14.gr. upplýsingalaga nr. 140/2012. Hjálögð eru afrit af umbeðnum reikningum vegna vitans við Sæbraut. Hjálagt er einnig útskrift úr bókhaldi sem sýnir yfirlit reikninga og færslur þeirra á bókhaldslykla.

Birgir Björn Sigurjónsson,
fjármálastjóri

Ámundi V. Brynjólfsson,
skrifstofustjóri

Hjálagt:

Svar Faxaflóahafna sf. dags 09.10.2018

Reikningar vegna verkefnisins Viti við Sæbraut

Yfirlit reikninga



Borgarráð Reykjavíkurborgar
b.t. Lindu Sifjar Sigurðardóttur
Ráðhúsi Reykjavíkur
101 Reykjavík

Reykjavík 9. október 2018

Efni: Fyrirspurn vegna verkefnisins: Viti við Sæbraut – R18100135

Vísað er til tölvupósts dags. 8.10. s.l varðandi ofangreint.

Svar við spurningu 1 („Hver er heildarkostnaður Faxaflóahafna sf. af verkefninu viti við Sæbraut?“)

Samkvæmt bókhaldi er kostnaðurinn þessi (október 2018). Bókfærður kostnaður er án vsk:

Verknúmer	E6512.Nýr viti við Sæbraut			
Summa af Lokastaða				
	2016	2017	2018	Alls
01-20-4-432.Verkfræði- og arkitektapjón.	1.237.083	3.757.325	394.669	5.389.077
01-20-4-437.Sérfræðipjónusta (m/vsk)		59.200		59.200
01-20-4-501.Samningsverð		4.396.882	4.273.146	8.670.028
01-20-4-525.Raflagnir			297.331	297.331
01-20-4-651.Vinna frá bækistöð			1.202.721	1.202.721
01-20-4-652.Leigugjald eigin véla			27.170	27.170
Alls	1.237.083	8.213.407	6.195.037	15.645.527

Svar við spurningu 3: („Hvaða hluti verkefnisins er greitt af Faxaflóahöfnum?“)

Megin verkefni Faxaflóahafna sf. er smíði á vita, sem unnin var á vegum bækistöðvar Faxaflóahafna sf, útfærsla og kaup á ljósbúnaði í vitann, en Faxaflóahafnir sf. báru einnig að hluta kostnað af breytingu á deiliskipulagi og vinnu við útfærslu á staðsetningu vitans, útfærslu á landgerð og umhverfi. Undirstaða vita er á nýju landi sem byggð er út frá núverandi strönd. Fyllingarefni og valið grjót til sjóvarna var fengið af efnislager Faxaflóahafna í Sundahöfn.

Svar við spurningu 5 („Var verkið boðið út samkvæmt innkaupareglum Reykjavíkurborgar og lögum um opinber fjármál?“)

Smíði vitahússins var hönnuð og útfærð af starfsmönnum Faxaflóahafna, en ljósbúnaður vitans, sem er sérhæfður, var pantaður erlendis frá í samstarfi við vitasvið Vegagerðar. Kostnaður þar að lútandi er í ofangreindu kostnaðaryfirliti færður undir „samningsverð“.

Svar við spurningu 6 („Hefur verkefnið dregist miðað við upphaflegan tíma um verklok?“)

Meðfylgjandi eru minnisblöð sem gefa mynd af ferli málsins, en Faxaflóahafnir hafa um all nokkurn tíma unnið að því að koma málinu á framkvæmdastig. Ferill málsins á skipulagsstigi tók sinn tíma. Reykjavíkurborg hefur annast gerð undirstöðu undir vita og frágang lands en væntingar eru um að þeim þætti sé að ljúka.


Svar við spurningu 7 (Hvenær eru áætluð verklok?“)

Ekki liggur fyrir staðfesting á því hvenær Faxaflóahafnir geta sett vitann upp og tengt hann þannig að vitinn þjóni hlutverki sínu. Þegar að nýr viti er risinn og siglingamerki hans orðin virk þarf að tilkynna sjófarendum um breytt siglingamerki fyrir Reykjavík, gefa út ný sjókort og slökkva á siglingamerki í turni Sjómannaskólans.

Svar við spurningu 8 (Hvernig skiptist kostnaðurinn á milli Faxaflóahafna og borgarinnar í þessu verkefnum?)

Faxaflóahafnir önnuðust hluta af undirbúningi verkefnisins (skipulagsuppdætti og frumhönnun á aðstöðu undir vitann). Faxaflóahafnir munu annast kostnað við uppsetningu vitans og nauðsynlegar tengingar við rafmagn. Samkomulag var um að Faxaflóahafnir greiði kr. 25,0 mkr. (vsk innifalinn) vegna framkvæmda við landfyllingu og grjótvörn undir vitann en annar kostnaður þess verkefnis og frágangur umhverfis vitann er greiddur af Reykjavíkurborg.

Viðingarfyllst



Gísli Gíslason, hafnarstjóri

Minnisblað

Vitinn í turni Sjómannaskólans í Reykjavík og siglingarmerkingar fyrir Gömlu höfnina í Reykjavík - úrbætur vegna nýrrar byggingar sem risin er við Höfðatorg


Í október 2008 kom í ljós að bygging, sem var að rísa við Höfðatorg í Reykjavík var farin að skyggja á innsiglingavitann á Sjómannaskólanum og byggingin staðsett í stefnulínunum vitans fyrir aðsiglingu að Gömlu höfninni.




Byggingin við Höfðatorg

Upplýsingar úr sjókortum

Merking Sjómannaskólavítans í sjókortum og stefnugeirar ljósmerka fyrir Engeyarsundið

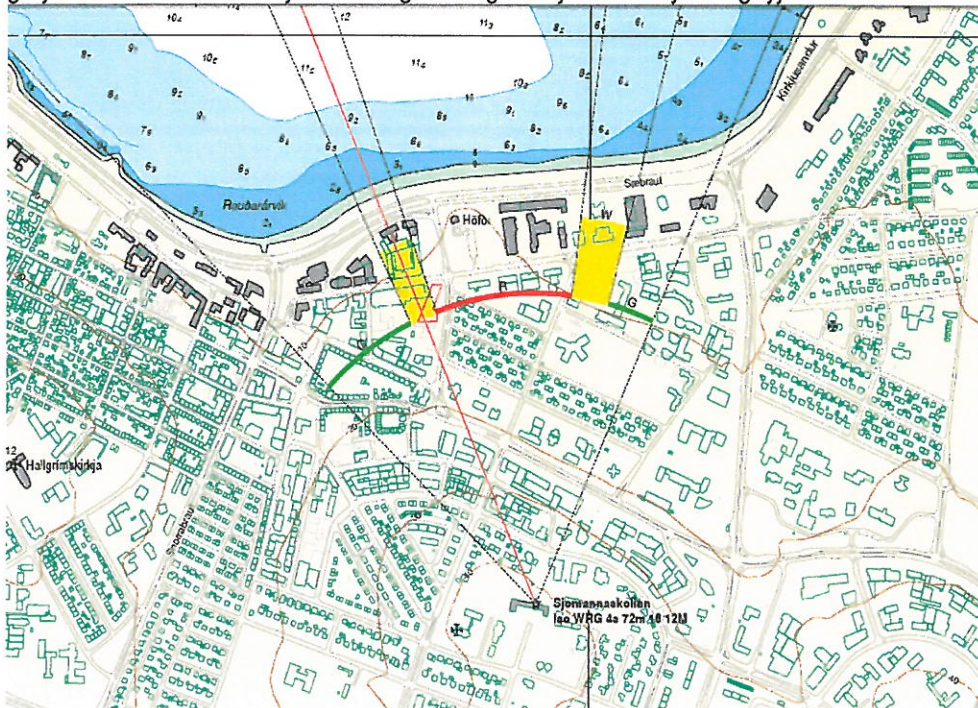

Myndin sýnir þann hluta innsiglingasvæðisins, sem byggingin skyggir á

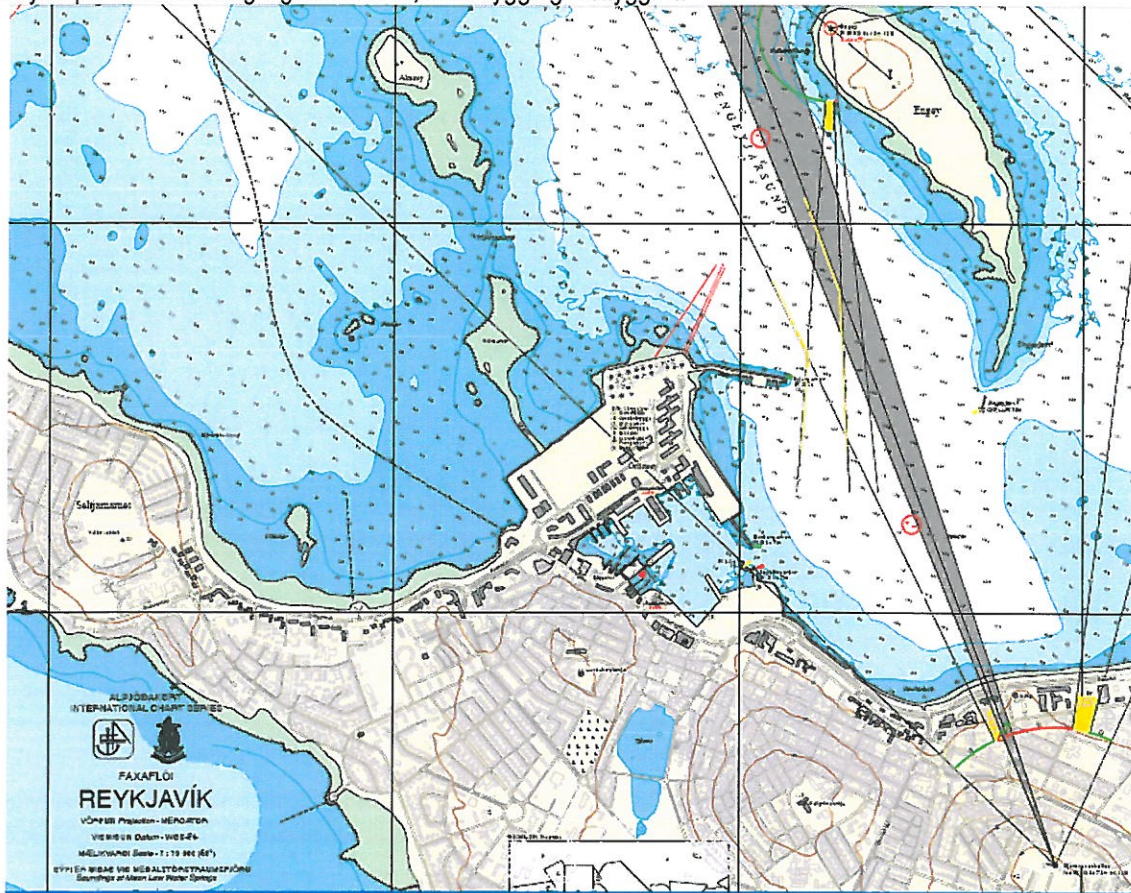

Eins og fram kemur á myndinni voru skilgreindar merkingar á innsiglingu að lenda í hvarfi af byggingunni án þess að tilkynningar um það hefðu verið sendar út. Upplýsingum um þetta var í framhaldinu komið til þeirra stofnana, sem sjá um tilkynningar til sjófarenda og sinna útgáfu sjó korta og eins var með bréfi dags. 9. nóvember vakin athygli skipulagsyfirlada á því hvað hér hafði gerst.

Upplýsingar um sögu og breytingar á deiliskipulagi fyrir Höfðatorgsreit

Til þess að skoða sögu deiliskipulagssamþykktar fyrir þessari byggingaáform var óskað eftir upplýsingum frá Skipulgs- og byggingarsviði Reykjavíkurborgar. Í minnisblaði, dags. 8. janúar 2009 er gerð grein fyrir málinu. Eins og þar er nefnt er það með breytingu á fyrra deiliskipulagi í febrúar 2007, sem það gerist að turnbygging er skilgreind, sem 19 hæðir og staðsett á horni Borgartúns/Höfðatúns. Taka verður fram að viti Sjómannaskólans er í um 72 m hæð og sést langt að. Öll uppbygging á nýrri byggð við Borgartúnið þar sem húsbyggingar fara í 6 - 8 hæðir á ekki að drag úr sýnileika vitans fyrir sjófarendur og því á margan hátt skiljanlegt að fólk hafi ekki gætt sín á þessu. Þetta kemur aftur á móti ekki á daginn fyrr en uppbygging húss er langt komin. Á árunum 2003 -2008 er deiliskipulag oft tekið til endurskoðunar og á því ferli gerast ýmsar breytingar svo sem að turnbygging er hækkuð og færð til.

Fyrstu viðbrögð varðandi þetta mál

Í dag er það svo að allur búnaður skipa til siglinga er allt annar og betri en áður var þegar að þessi viti var byggður fyrir um 60 árum. Mikilvægi hans sem sýnilegt siglingamerki er því ekki það sama og áður var og ef sjófarendur hafa um þetta vitneskju eru ekki miklar líkur á að óhöppum. Fyrstu viðbrögð voru því að koma þessum upplýsingum á framfæri með formlegum hætti.

Hvaða kostir eru til þess að bæta úr þessu og tryggja góðar merkingar á aðsiglingu að Gömlu höfninni Vitamálið hefur verið rætt nokkuð ýtarlega við þá aðila og stofnanir sem fjalla um vitamál, sjókort og upplýsingar til sjófarenda. Í þeim viðræðum hefur verið reynt að meta það hvaða kostir eru í stöðunni. Á samráðsfundi með Skipulags- og byggingarsviði í lok október 2008 var óskað eftir að allir kostir í þessu máli yrðu greindir og það skoðað hvað leið skyldi fara til úrlausnar.

Eftirfarandi kostir hafa verið skoðaðir:

1. Möguleikar þess að koma vita á topp þessarar nýju byggingar. Þeim kosti hefur verið hafnað þar sem hæð byggingarinnar (og nálægð) er of mikil. Merkin þurfa að sjást fyrir allar stærðir skipa og báta.
2. Möguleg lausn að fella vita og ljósbúnað inn í bygginguna. Menn eru sammála um að sú lausn gengur ekki. Vitaljós inni í miðju ljósahafi byggingarinnar gengur ekki.
3. Möguleiki þess að reistur verið viti á þak eldri bygginga fyrir framan Höfðatorgið. Þetta er mögulegur kostur, en er bundinn því að bygging verði ekki rifin og eins því hvort að ljósbúnaður vitans falli of milkið inn í ljósin á byggingunni í bakgrunninum.
4. Möguleiki þess að reistur verði nýr viti á fyllingarkantinum utan Sæbrautar. Þessi kostur er líklega sá vænlegasti. Siglingastofnun hefur kannað það að hægt er að fá sérstakan ljósbúnað erlendis, sem frá einu ljósmerki gefur rétt stefnumerki. Þessi ljósbúnaður er framleiddur á Nýja Sjálandi og hefur reynst vel fyrir. Utan um þennan ljósbúnað þarf að byggja lokað rými og það þarf að vera í þeirri hæð yfir landi að ljós frá umferð á Sæbraut og eins byggð í bakgrunni skapi ekki villuljós. Þetta er aftur á móti dýrari kostur en sá sem nefndur var hér á undan.

Niðurstaða er sú að kostir 3 og 4 koma báðir til greina.

Nýr viti

Með orðinu viti er hér átt við ljósbúnað með lokuðu rými umhverfis búnað, sem komið er fyrir á undirstöðu þannig að ljósmerki hafa þá hæð yfir jörð að ljósmerkið sjáist vel, sé aðgreint frá öðrum ljósum í bakumhverfi og geti í björtu verið ákveðið kennileiti. Hafa verður í huga að þetta mannvirki verður áberandi í umhverfinu á þessum stað enda er það í raun tilgangurinn þannig að merkið sjáist vel að.

Nýr viti á þaki eldri bygginga (kostur 3)

Til frekari skoðunar á hvar möguleiki sé að staðsetja ný vitamannvirki hafa miðlinur siglingageirans verið skoðaðar og á meðfylgjandi mynd sést hvar sú miðlína liggur. Til greina koma tvær byggingar. Þetta er sett fram með þeim fyrirvörum að leyfi fáið fyrir vitabúnaðinum á þessum byggingum, aðgengi að búnaðinum sé tryggt, rafmagn og fl. Reikna má með að kostnaður við kaup á ljósbúnaði uppsetningu og frágang verði á bilinu 15 - 20 m kr. Kaup á ljósbúnaðinum einum sér er kostnaður upp á um 8 m kr.

Nýr viti á fyllingarkantinum utan Sæbrautar (kostur 4)

Reikna má með að einfaldasti umbúnaður til þess að koma þessu vitamerki upp kosti um 25 m kr (með vsk). Kaup á ljósbúnaðinum einum sér er kostnaður upp á um 8 m kr og undirstöður, mastur og rými um búnaðinn uppkomið kostar líklega um 15- 20 m kr eftir því hversu vandað verður til mannvirkis og frágangs.

Hér er þeirri hugmynd kastað fram að mannvirkið og frágangur þess verði gerður að ákveðnu kennileiti fyrir Gömlu höfnina í Reykjavík og vitinn verði gerður í eftirlíkingu innsiglingavitanna fyrir Gömlu höfnina. Kostnaður við þá framkvæmd er áætlaður um 30 m kr (með vsk). Mannvirkið yrði þá áberandi eins og það þarf að vera og heldur á lofti merki um sögu hafnar í Reykjavík. Mannvirkið aðskilur sig þá frá ásýnd nýrra bygginga við Borgartúnið.

Lokaorð

Fá þarf niðurstöðu í ábyrgð á þessu máli og hver skuli bera kostnað af þessu. Lög eru nokkuð leiðbeinandi um þetta sbr. Lög um vitamál nr. 132 frá 1999. Þar segir ma:

4. gr. Óheimilt er að byggja hús eða mannvirki sem skyggt gætu á leiðarmerki frá sjónum á þeim boga sjóndeildarhringsins þar sem því er ætlað að þjóna sjófarendum, og hæfilega langt til beggja handa.


Hér er bent á eiganda húss, sem skyggir á vitann.

Ef menn eru því sammála að unnið verði að þeirri lausn, sem hér er bent á er næsta stig að þessar tillögur verði útfærðar frekar og það skoðað hvernig að þessi lausn fer í umhverfinu. Reikna má með að það taki nokkra mánuði að smíða vita, útvega ljósbúnað og gera hann virkann frá því að ákvarðanir og samþykktir liggja fyrir.



Jón Þorvaldsson

Landhelgisgæsla Íslands, sjómælingasvið
KOLLEFJÖÐUR
Tillaga að staðsetningu innsiglingarvita við Sæbraut norðan Höfða
Gert fyrir Faxaflóahafnir í nóvember 2015
VIDEYJARFLAK
Notist ekki til siglinga

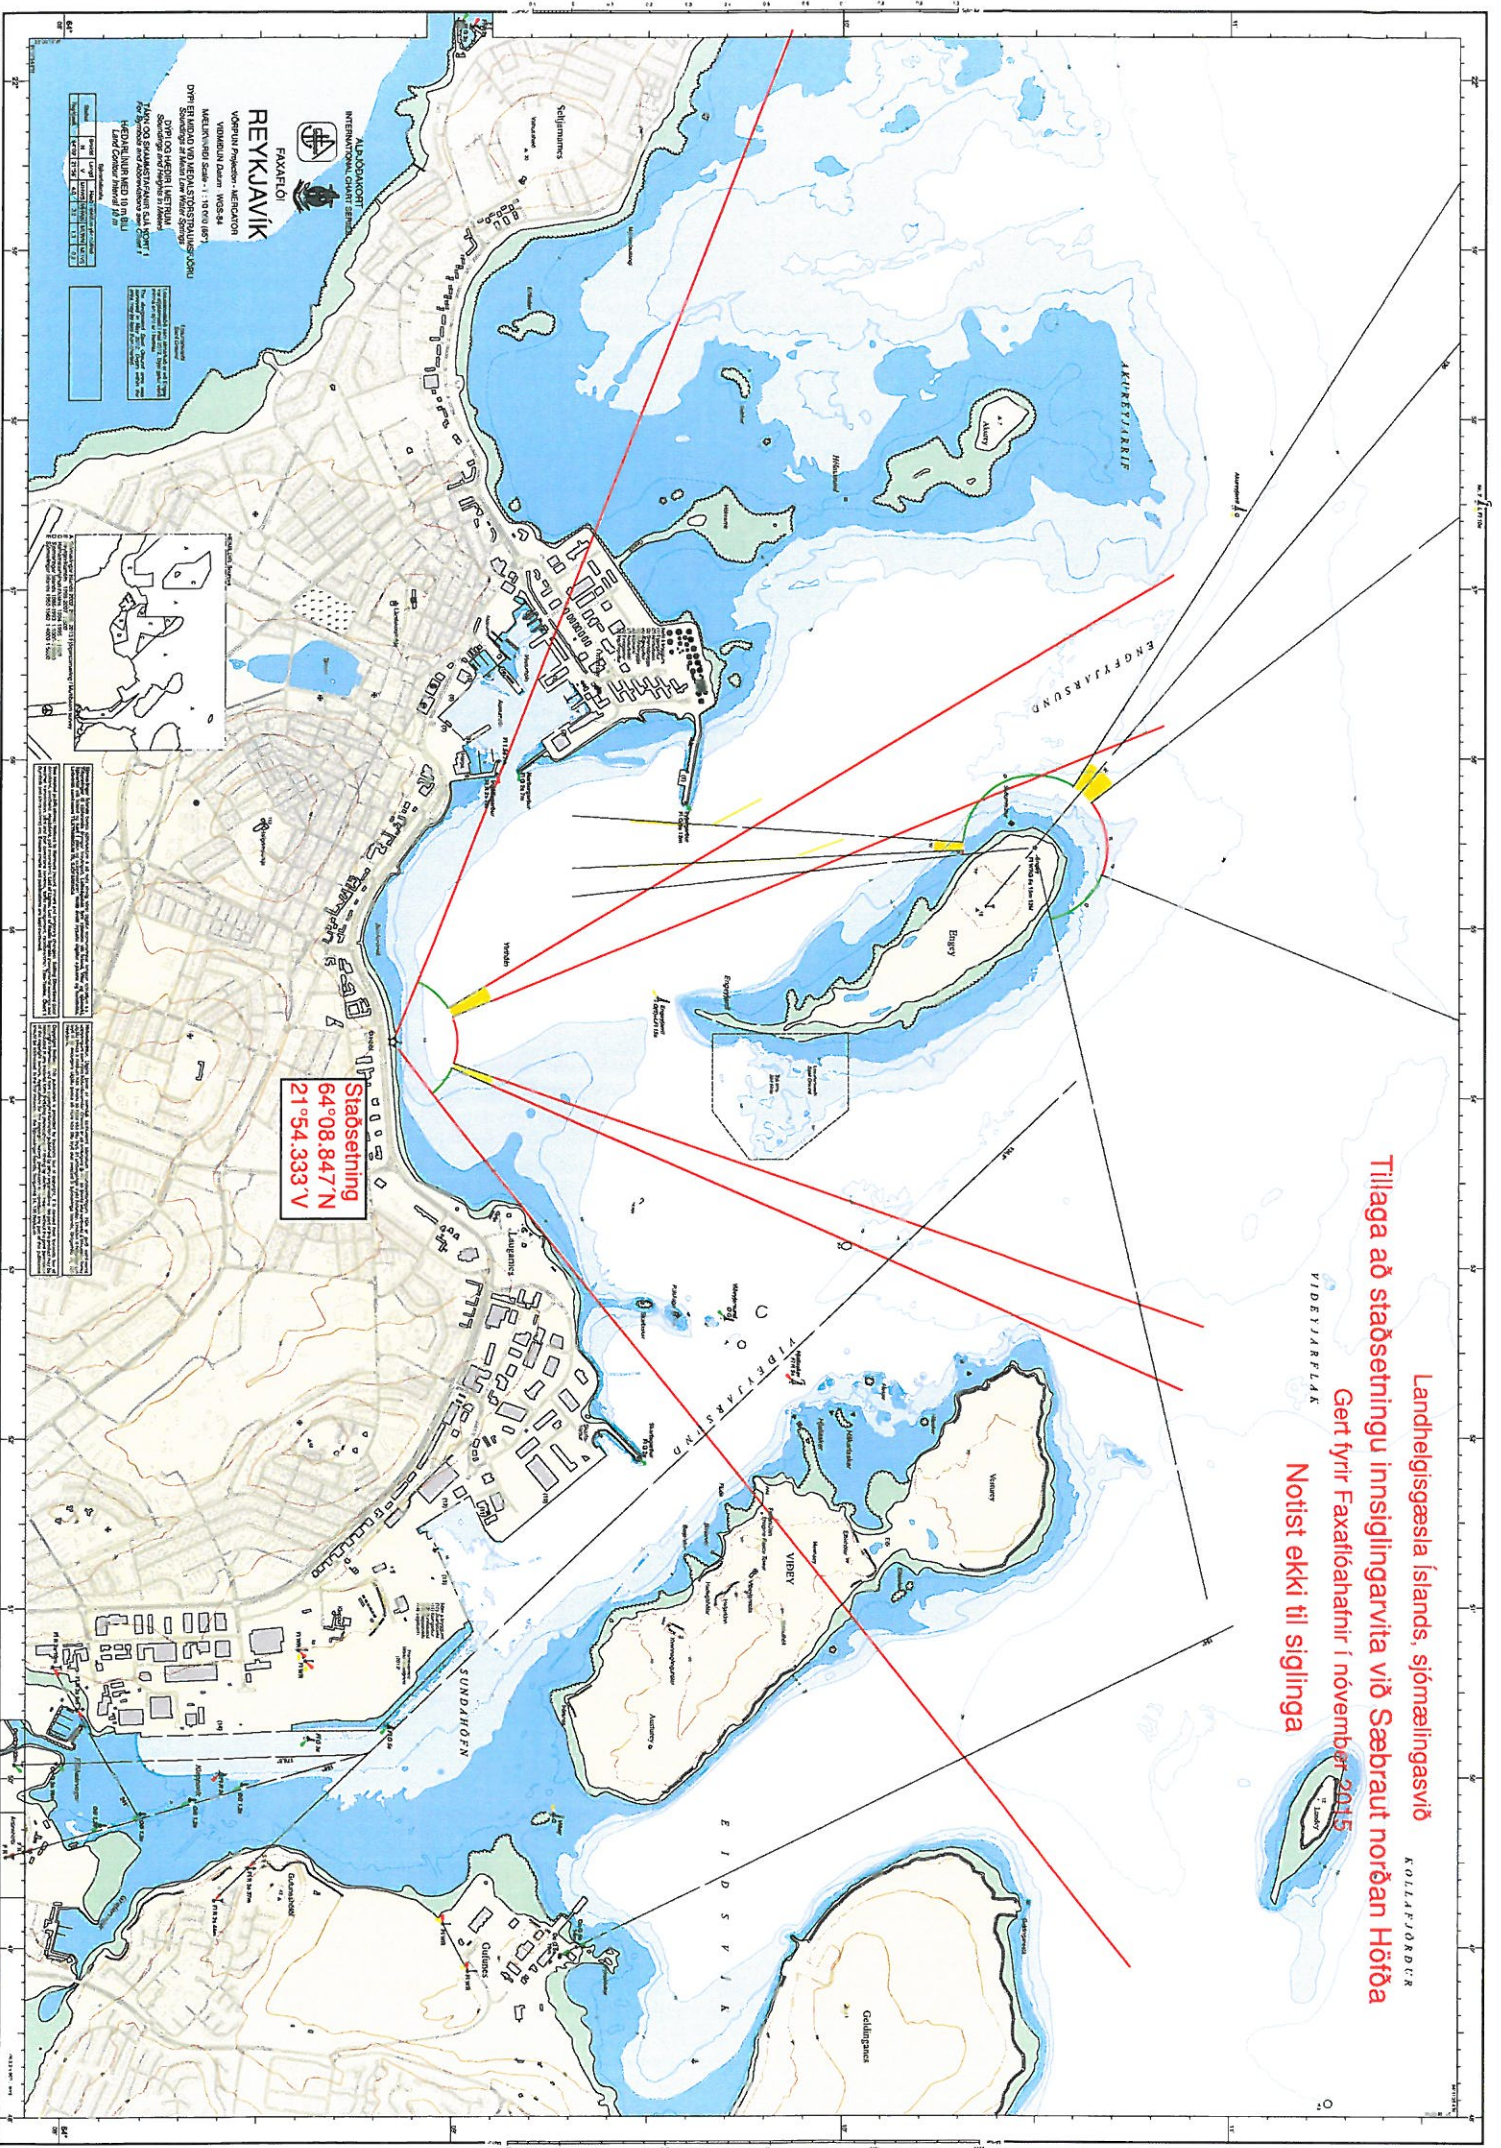

Minnisblað um vitamál

Fyrsti vitinn í Reykjavík var byggður árið 1897 en áður höfðu verið settar út tvær baujur til að merkja innsiglinguna til Reykjavíkur. Vitinn stóð við Vitastíg skammt frá því sem nefnt er Vitatorg.

Árið 1945 var Sjómannaskólinn vígður og var í turni skólans innsiglingarviti, sem þjónaði hluverki sínu allt fram á síðustu ár. Með skipulagsbreytingum í Borgartúni og Hátúni hafa þar hægt og bítandi risið háhýsi sem skyggja á geisla Sjómannaskólavítans þannig að hann þjónar nú ekki lengur hlutverki sínu. Þórarinn Eldjárn orðar þetta svo í ljóði sínu Höfðatorg:

Til hvers þennan turn
við torgið, mér er spurn.

Steypa, gler og stál,
stáss og þrjálf.

Eitthvert apaspil
auðs sem hvergi er til.

Eins og gerist oft,
eintómt loft.

Brengluð borgarmynd,
beinagrind.

Peningapúkar á bita
pyngju vildu fita.

Ekki sést ljós frá innsiglingarvita.



Faxaflóahafnir hafa komið á framfæri ábendingum um málið til skipulagsráðs Reykjavíkur og jafnframt bent á þær lausnir sem eru til þess að tryggja örugga merkingu siglingaleiðarinnar í Gömlu höfnina og í Sundahöfn. Faxaflóahafnir telja tvær leiðir koma til greina. Annars vegar útsetning á tveimur baujum á siglingarleiðina sambærilegt því sem gert var fyrir árið 1897 eða að setja innsiglingarvita á Sæbraut rétt austan Höfða. Kostnaður við baujur er nokkru minni en bygging vita, en rekstrarkostnaður á baujum hugsanlega meiri og líftími þeirra takmarkaðri. Þeirri tillögu hefur verið hreyft að efna til samstarfs við Reykjavíkurborg um byggingu vita við Sæbraut. Hlutur borgarinnar yrði að ganga frá undirstöðu vítans, en Faxaflóahafna sf. að koma með vitahúsið og nauðsynlegan ljósbúnað. Hlutur Faxaflóahafna sf. væri þannig áætlaður um 20 - 25 mkr. Tillagan byggir á því að vitinn verði með sama útliti og innsiglingarvitarnir í Gömlu höfnina, sem hafa verið með sama útlit frá byggingu hafnarinnar á árunum 1913-1917 auk þess sem viti á Skarfagarði í Sundahöfn er með sama sniði. Frágangur vita við Sæbraut myndi jafnframt nýtast sem útsýnispallur eða áningarstaður á gönguleiðinni með sjónum.



Sú tillaga er sett fram að leitað verði eftir samstarfi við Reykjavíkurborg um verkefnið. Í því felst að deiliskipulagi verði breytt þannig að byggja megi vitann og undirstöður hans og gengið frá samkomulagi um skiptingu kostnaðar á grundvelli framangreinds.

Reykjavík 11. mars 2015
Gísli Gíslason, hafnarstjóri.



Minnisblað

14. janúar 2018 – Jón Þorvaldsson

Nýr viti við Sæbraut í stað Sjómannaskólavítans

Upptalning á helstu atriðum sem þarf að ræða við upphaf framkvæmda:

Deiliskipulag samþykkt

Nýr viti í smíðum. Hann verður tilbúinn til uppsetningar í febrúar 2018

Ljósmerki og ljósbúnaður hefur verið pantaður, er kominn til landsins og tilbúinn til uppsetningar

Landgerð og grjótröðun:

1. Semja þarf við verktaka með reynslu af grjóthleðslum um land- og grjóttfrágang
2. Reikna þarf efnismagn og skilgreina frágang þversniða
3. Hvaðan er fyllingarefnið sótt. ? Hvaðan er valið grjót fengið?
4. Æskilegt að framkvæma á meðan að frost er í jörðu
5. Verktími er jan - febr 2018

Þarf ákvörðun um hvort að svæðið umhverfis verður steipt plata með þá td einhverjum yfirborðsfrágangi sbr komásmýnd. Spurning um hrjúfleika yfirborðs og öryggi til gangs í frosti

Heil berandi plata þá líklega bitar eða þilplötur sem berandi undirstöður. Settar 6 -8 þilplötur (staurar) Ef eingöngu undirstaða fyrir vita þá líklega 3 þilplötur og steipt plata (stöpull) undir vita

Útboðsverk:

1. Steipt plata og síðan allar rampa- og tröppusteypur
2. Frágangur yfirborðs steyptra flata
3. Fyllingar í mannvirkið
4. Handrið og allt annað sem mannvirkinu fylgir
5. Lýsing fyrir mannvirkið
6. Heimtaugar frá Veitum fyrir rafmagn
7. Þarf hita í tröppur og rampa?
8. Gengið frá grjóthleðslum að steiptum mannvirkjum
9. Skilti og merkingar
10. Gengið frá stalli undir vita eftir að hann er settur upp á undirstöður
11. Viðgerðir og frágangur á stígum og umhverfi eftir framkvæmdarask
12. Verktími er mars - apríl 2018

Vitinn vígður þann 11. maí 2018

Ný siglingamerki tilkynnt og gefin út í sjókortum. Sjómannaskólaviti þá formlega afskráður og slökkt á merkjum

Jón Þorvaldsson
aðstoðarhafnarstjóri

T	TT	Færslunr.	Dags.reikn.	Tímabil	Víd3	Víd3 (T)	VSK	Texti	Fjárhæð	Vmannanr.	Vmannanr. (T)
A	R7	125071711	31.10.2018	201810	153144	Viti við Sæbraut - Framkvæmd	8	Verkfr.þj. Viti við Sæbraut - eftirlit	676.150,00	11669	V.S.Ó. Ráðgjöf ehf
B	R1	91040596	31.3.2018	201803	153143	Viti við Sæbraut - Hönnun	8	13372003 Aðgengisúttekt - Viti við Sæbraut	110.268,00	10710	Verkis hf.
B	R1	91041383	31.3.2018	201803	153143	Viti við Sæbraut - Hönnun	8	Verkfr.þj. Viti við Sæbraut	2.131.465,00	11090	Mannvit hf
B	R1	91048513	31.7.2018	201807	153143	Viti við Sæbraut - Hönnun	8	Verkfr.þj. Verk nr. 1.250.233 Viti við Sæbraut	544.140,00	11090	Mannvit hf
B	R1	91049383	31.8.2018	201808	153143	Viti við Sæbraut - Hönnun	8	Verkfr.þj. Viti við Sæbraut	364.725,00	11090	Mannvit hf
B	R1	91051187	30.9.2018	201809	153143	Viti við Sæbraut - Hönnun	8	Verkfr.þj. Viti við Sæbraut	34.830,00	11090	Mannvit hf
B	R7	125066331	31.1.2018	201801	153143	Viti við Sæbraut - Hönnun	8	Verkfr.vinna v. Viti við Sæbraut	666.220,00	11090	Mannvit hf
B	R1	91045072	31.5.2018	201805	153143	Viti við Sæbraut - Hönnun	8	Verkfr.þj. Viti við Sæbraut	2.869.718,00	11090	Mannvit hf
B	R1	91052741	31.10.2018	201810	153143	Viti við Sæbraut - Hönnun	8	Verkfr.þj. Viti við Sæbraut	26.663,00	11090	Mannvit hf
B	R1	91041384	31.3.2018	201803	153143	Viti við Sæbraut - Hönnun	8	Verkfr.þj. Viti við Sæbraut	1.079.320,00	11090	Mannvit hf
B	R1	91046864	30.6.2018	201806	153143	Viti við Sæbraut - Hönnun	8	Verk nr. 1.250.233 Vit við Sæbraut	3.752.977,00	11090	Mannvit hf
B	R7	126059114	30.9.2018	201809	153143	Viti við Sæbraut - Hönnun	8	Vinna ráðgjafa á framkvæmdatíma við vita við Höfða	138.958,00	33548	Yrki arkitektar ehf
B	R7	125069464	31.7.2018	201807	153143	Viti við Sæbraut - Hönnun	8	Arkitektapj. Viti við Höfða	546.150,00	33548	Yrki arkitektar ehf
B	R7	127044317	31.8.2018	201808	153143	Viti við Sæbraut - Hönnun	8	Vinna ráðgjafa við framkvæmd vegna vitans i við Höfða	588.802,00	33548	Yrki arkitektar ehf
B	R7	127042898	6.7.2018	201808	153143	Viti við Sæbraut - Hönnun	0	Prentun v. vitann við Höfða	71.503,00	33548	Yrki arkitektar ehf
B	R7	126057232	31.3.2018	201804	153143	Viti við Sæbraut - Hönnun	8	Arkitektapj. Viti við Höfða	311.245,00	33548	Yrki arkitektar ehf
B	R7	125068438	30.4.2018	201804	153143	Viti við Sæbraut - Hönnun	8	Arkitektavinna v. Viti við Höfða	240.268,00	33548	Yrki arkitektar ehf
B	R7	127042265	30.6.2018	201806	153143	Viti við Sæbraut - Hönnun	8	Viti við Höfða - útb.gögn og fundir	736.037,00	33548	Yrki arkitektar ehf
B	R7	127042244	30.6.2018	201806	153143	Viti við Sæbraut - Hönnun	8	Vinna ráðgjafa við uppfærslu á aðaluppdráttum Viti við Höfða	1.509.502,00	33548	Yrki arkitektar ehf
B	R7	125068402	30.4.2018	201805	153143	Viti við Sæbraut - Hönnun	8	Arkitektavinna v. viti við Höfða	3.092.540,00	33548	Yrki arkitektar ehf
B	R7	126056743	28.2.2018	201802	153143	Viti við Sæbraut - Hönnun	8	Arkitektarþj. v. Viti við Höfða - verkt.útb.gögn og fundir	310.448,00	33548	Yrki arkitektar ehf
B	R7	126057191	31.3.2018	201804	153143	Viti við Sæbraut - Hönnun	8	Arkitektapj. vinna ráðgjafa við aðaluppdrætti - Viti við Höfða	3.348.510,00	33548	Yrki arkitektar ehf
B	R7	127043559	31.7.2018	201807	153144	Viti við Sæbraut - Framkvæmd	8	Verk nr. 18156 Viti við Sæbraut - Eftirlit	1.171.450,00	11669	V.S.Ó. Ráðgjöf ehf
B	R7	125068411	30.4.2018	201804	153144	Viti við Sæbraut - Framkvæmd	8	Eftirlit v. framkv. viti við Höfða	328.700,00	11669	V.S.Ó. Ráðgjöf ehf
B	R7	127045303	30.9.2018	201810	153144	Viti við Sæbraut - Framkvæmd	8	Verk nr. 18156 Viti við Sæbraut - Eftirlit	1.532.500,00	11669	V.S.Ó. Ráðgjöf ehf
B	R7	125067943	31.3.2018	201804	153144	Viti við Sæbraut - Framkvæmd	8	Eftirlit v. framkv. Sæbraut	363.300,00	11669	V.S.Ó. Ráðgjöf ehf
B	R7	126057076	28.3.2018	201803	153144	Viti við Sæbraut - Framkvæmd	0	Viti við Sæbraut	#####	11691	Suðurverk hf
B	R7	125071497	20.10.2018	201810	153144	Viti við Sæbraut - Framkvæmd	0	Viti við Sæbraut - Framvinda#3	950.227,00	11691	Suðurverk hf
B	R7	127042428	13.7.2018	201807	153144	Viti við Sæbraut - Framkvæmd	0	Viðbótarverk, niðurrekstur staura	6.859.630,00	11691	Suðurverk hf
B	R7	126057485	30.4.2018	201805	153144	Viti við Sæbraut - Framkvæmd	0	Viti við Sæbraut - Framvinda#2	#####	11691	Suðurverk hf
B	R0	200009704	20.2.2018	201802	153144	Viti við Sæbraut - Framkvæmd	0	Framkvæmdaleyfi	126.000,00	11853	Reykjavíkurborg
B	R7	200010461	2.7.2018	201807	153144	Viti við Sæbraut - Framkvæmd	0	Auglýsing: Útboð nr.14261 Innsiglingarviti við Sæbraut	16.984,00	11853	Reykjavíkurborg
B	R1	200010059	24.4.2018	201805	153144	Viti við Sæbraut - Framkvæmd	0	Yfirferð sérteikninga, Erindi :BN054463	115.500,00	11853	Reykjavíkurborg
B	R1	200010059	24.4.2018	201805	153144	Viti við Sæbraut - Framkvæmd	0	Vottorð um lokaúttekt, Erindi :BN054463	19.500,00	11853	Reykjavíkurborg
B	R1	200010059	24.4.2018	201805	153144	Viti við Sæbraut - Framkvæmd	0	Áfangaúttektir, Erindi :BN054463	55.000,00	11853	Reykjavíkurborg
B	R1	200010059	24.4.2018	201805	153144	Viti við Sæbraut - Framkvæmd	0	Lokaúttekt, Erindi :BN054463	22.000,00	11853	Reykjavíkurborg
B	R7	200010461	2.7.2018	201807	153144	Viti við Sæbraut - Framkvæmd	0	Auglýsing: Útboð nr.14261 Innsiglingarviti við Sæbraut	5.643,00	11853	Reykjavíkurborg
B	R7	125069899	14.8.2018	201808	153144	Viti við Sæbraut - Framkvæmd	0	Innsiglingarviti við Sæbraut - Útsýnisvallur, tröppur og skábraut	651.000,00	13768	Spöng ehf
B	R7	125070746	18.9.2018	201809	153144	Viti við Sæbraut - Framkvæmd	0	Innsiglingarviti við Sæbraut - Útsýnisvallur, tröppur og skábraut - framvindureikn. nr. 2	#####	13768	Spöng ehf
B	R7	125070746	18.9.2018	201809	153144	Viti við Sæbraut - Framkvæmd	0	Innsiglingarviti við Sæbraut - Útsýnisvallur, tröppur og skábraut - framvindureikn. nr. 2	600.000,00	13768	Spöng ehf
B	R7	125069899	14.8.2018	201808	153144	Viti við Sæbraut - Framkvæmd	0	Innsiglingarviti við Sæbraut - Útsýnisvallur, tröppur og skábraut	9.506.800,00	13768	Spöng ehf
B	R7	126057001	10.4.2018	201804	153144	Viti við Sæbraut - Framkvæmd	0	Hreinsa brunna og ídráttarrör á milli brunna, losun á típp	131.937,00	43978	Spissar ehf

Seljandi

Verkís hf
Kt. 6112760289
Ofanleiti 2
103 Reykjavík,

Sími: 3544228000
Fax:
Vsknr. 10503

REIKNINGUR
Reikningsnr. 127431

Greiðandi Reykjavíkurborg - eignasjóður Borgartúni 10-12 105 Reykjavík Kt. 5704800149	Gjaldddagi 30.04.2018	Eindagi
	Útgáfudagur reiknings: 31.03.2018 Reikningstímabil: - GLN Kennitala: 5704800149	Til greiðslu 136.732,00
	Gjaldmiðill á reikningi: ISK	
Ath. fylgiskjal er með reikning, sjá "Skjöl".		

Greiðsluupplýsingar	Millifærsla
Banki: [REDACTED]	Höfuðbók: [REDACTED]
Reikningsnr. [REDACTED]	Kennitala: 6112760289
Upphæð: 136.732,00	
Lýsing: 13372003 Aðgengisúttekt - Viti við Sæbraut	
Bókunarupplýsingar: Verkbeiðnanúmer: 153143	
Viðskiptareikningur: 5704800149	
Pöntun nr:	
Afhending Dags:	
Skilmálar:	
Tengiliður:	

Vörunn.	Lýsing	Magn	Eln.	Eln Verð*	Vsk.	Afsl. kr.	Upphæð	Upphæð m. vsk.
1.	Samkvæmt meðfylgjandi fylgiskjali	1.000000	EA	110.268,00	S	0	110.268,00	136.732,32
2.		-1	EA	0,00	E	0	0,00	0,00
Det finns 2 bilagor till denna faktura. Se nedan:								
3.		-1	EA	0,00	E	0	0,00	0,00
https://ws.inexchange.is/connector/rest.svc/download/attachment/ed2f8ec8a68244e8941c0ce95bbe9703								
4.		-1	EA	0,00	E	0	0,00	0,00
https://ws.inexchange.is/connector/rest.svc/download/attachment/c2c5efc6935649cea381bfbbb19b5e31								

Fjöldi lína: 4 *Ath. Einingaverð eru birt án vsk.

Samtals: 110.268
Samtals vsk: 26.464
Afrúningur aura: 0,00
Samtala Reiknings: 136.732,00

Samantekt á vsk:	Skattskyld upphæð:	Skattur:
S (24,0%)	110.268,00	26.464,00
Samtals virðisaukaskattur: 26.464		

Ítarupplýsingar seljanda:

E-mail: fjarmalasvid@verkis.is
Sími: 3544228000
Vsknr. 10503
GLN Staðsetning:
6112760289
Viðskiptamannanúmer:
6112760289

Ítarupplýsingar kaupanda:

Tengiliður kaupanda:
Þór Gunnarsson
E-mail: fjarmalasvid@verkis.is
Sími: 3544228000
GLN Staðsetning:
5704800149
Viðskiptamannanúmer:
5704800149

Ítarupplýsingar á línunum:

Vörunn. birgja	Vörunn. staðlað	Vöruflokkun (UNSPSC)	Bókunarupplýsingar	Pöntun	Lína pöntunar
1			13372003		
2					
3					
4					

Ítarupplýsingar um afslætti og gjöld á einingum

Línunr.	Vörunn. birgja	Afsláttur / Gjöld	Prósenta	Grunnupphæð	Upphæð
1.		Afsláttur	,0	122.520,00	12.252,00

Viðhengi

Nr.	Tegund	Tilvísun
Fylgisk_m_verkreikn.pdf	Fylgisk_m_verkreikn.pdf	
Sölureikningur - 127431.pdf	Sölureikningur - 127431.pdf	

Reikningur

FRAMKV. OG EIGNASVIÐ/EIGNASJÓÐ RVK, USK,

Þór Gunnarsson
Borgartún 12-14
105 Reykjavík

Kennitala 6812720979

Vsk nr. 15519

Banknr. [REDACTED]

Reikningsnúmer R1212135

Reikn.færast á viðskm. 570480-0149

Bókunardags. 31.10.2018

Gjaldldagi 30.12.2018

Verk nr. 18156

Viti við Sæbraut - Eftirlit/verkbnr 153144

Þóknun Skv. Meðfylgjandi Skilagrein

Samtals án VSK 676.150

VSK-upphæð 162.276

Samtals með VSK 838.426

Greiðsluupplýsingar:

6812720979> 0180925+ 03< 011566> 311018+



Þessi reikningur er upprunninn í bókhalds- og áætlunarkerfi sem er sniðið eftir reglugerð nr. 505/2013

VSÓ RÁÐGJÖF

Borgartún 20, 105 Reykjavík
Sími: 5859000, Fax: 5859010
Netfang: vso@vso.is
Heimasíða: www.vso.is

Vinsamlegast athugið, reikningar greiðist innan 20 daga frá dagsetningu reiknings.

Reykjavíkurborg - eignasjóður
Þór Gunnarsson
Borgartúni 10-12
105 Reykjavík
Ísland

Reikningsnúmer 127431
Bókunardags. 2018.3.31
Gjaldddagi 2018.4.30
Viðskiptamaður nr. 570480-0149

Verkfang	13372	Sæbraut, Reykjavík
Verk nr.	13372003	Aðgengisúttekt - Viti við Sæbraut

Verkbeiðnanúmer: 153143

Lýsing	Upphæð
Vinna	122.520
Reikningsafsláttur	-12.252
Samtals án VSK	110.268
24 % VSK	26.464
Samtals með VSK	136.732

Bankaupplýsingar:

Númer bankareiknings: 

Athugasemdir þurfa að berast innan mánaðar frá dagsetningu reiknings, annars telst hann samþykktur
Þessi reikningur er upprunninn í bókhalds- og áætlunarkerfi sem er sniðið eftir reglugerð nr. 505/2013

Verkís hf Ofanleiti 2 103 Reykjavík, Sími: 354 422 8000
Kt. 611276-0289 - VSKnr. 10503
fjarmalasvid@verkis.is, www.verkis.is

Reykjavíkurborg - eignasjóður
Þór Gunnarsson
Borgartúni 10-12
105 Reykjavík
Ísland

Reikningsnúmer 127431
Bókunardags. 2018.3.31
Gjaldddagi 2018.4.30
Viðskiptamaður nr. 570480-0149

Verkfang	13372	Sæbraut, Reykjavík
Verk nr.	13372003	Aðgengisúttekt - Víti við Sæbraut

Verkbeiðnanúmer: 153143

Lýsing	Upphæð
Vinna	122.520
Reikningsafsláttur	-12.252
Samtals án VSK	110.268
24 % VSK	26.464
Samtals með VSK	136.732

Bankaupplýsingar:

Númer bankareiknings: 

Athugasemdir þurfa að berast innan mánaðar frá dagsetningu reiknings, annars telst hann samþykktur
Þessi reikningur er upprunninn í bókhalds- og áætlunarkerfi sem er sniðið eftir reglugerð nr. 505/2013

Verkís hf Ofanleiti 2 103 Reykjavík, Sími: 354 422 8000
Kt. 611276-0289 - VSKnr. 10503
fjarmalasvid@verkis.is, www.verkis.is

Reykjavíkurborg - eignasjóður
Fjármálaskrifst. Reykjavíkurb.
Borgartúni 12-14
105 Reykjavík

Sala - Reikningur
Bl. 1 af 1



MANNVIT

Reikningsfæriskrá á viðskm. 570480-0149
Bókunardags. 31. mars 2018
Gjaldldagi 30. apríl 2018
Reikningsnr. SRB86141

Verk nr. 1.250.233 Viti við Sæbraut

Lýsing	Magn Mælieining	Ein.verð	Afsláttur %	Álag %	Alls
Hönnun og gerð útboðsgagna-Stjórnun, samræming, fundir o.fl. V02-001					
Sigurður Guðjón Jónsson	36,0 KLST	19.750,00	10%		639.900
Eyjólfur Valgarðsson	4,0 KLST	19.750,00	10%		71.100
					711.000
Hönnun og gerð útboðsgagna-Burðarvirki, undirstöður o.fl. V02-002					
Eyjólfur Valgarðsson	79,0 KLST	19.750,00	10%		1.404.225
Björn Arnar Rafnsson	1,0 KLST	12.300,00	10%		11.070
					1.415.295
Alls	120,0 KLST				2.126.295
Annar kostnaður					
BH-H38 NISSAN LEAF	20,0 Kílómetrar	129,25			2.585
BH-H38 NISSAN LEAF	20,0 Kílómetrar	129,25			2.585
					5.170
Vinna og kostnaður					2.131.465
Heildar ISK án VSK					2.131.465
Vsk-upphæð					511.552
Samtals ISK með VSK					2.643.017

Banki Íslandsbanki
Bankanr. 
Kennitala 430572-0169

Þessi reikningur er upprunninn í rafrænu bókhaldskerfi sem uppfyllir reglugerð nr. 505/2013
Athugasemdir skulu gerðar fyrir gjalddaga reiknings, annars telst hann réttur

Mannvit hf - Urðarhvarfi 6 - 203 Kópavogur - Sími 422 3000 - verkboekhald@mannvit.is - Kt. 4305720169 - Vsknr 11430

Verkkaupi Verk	Reykjavíkurborg - eignasjóður 1.250.233 Víti við Sæbraut		
Starfsmaður	Tímar	Dags	Hvað gert
Hönnun og gerð útboðsgagna-Stjórnun, samræming, fundir o.fl.			
Sigurður Guðjón Jónsson	0,5	09.02.18	Samskipti, skipulag, viti o.fl.
Sigurður Guðjón Jónsson	2,5	15.02.18	Fundur með verkkaupa og arkitektum o.fl.
Sigurður Guðjón Jónsson	4	16.02.18	Fundur með verktaka, gagnaöflun, samskipti, skipulag, líkan o.fl.
Sigurður Guðjón Jónsson	3	20.02.18	Samskipti, skipulag, fundur með arkitektum o.fl.
Sigurður Guðjón Jónsson	1,5	21.02.18	Samskipti, skipulag, teikningar o.fl.
Sigurður Guðjón Jónsson	4	22.02.18	Samskipti, skipulag, fundur með Suðurverk, fundur með verkkaupa og arkitekt o.f
Sigurður Guðjón Jónsson	1	23.02.18	Samskipti, skipulag, teikningar o.fl.
Sigurður Guðjón Jónsson	2,5	01.03.18	Samskipti, skipulag, samræming o.fl.
Sigurður Guðjón Jónsson	2,5	06.03.18	Samskipti, skipulag, samræming, fundur o.fl.
Sigurður Guðjón Jónsson	1	09.03.18	Samskipti, skipulag, fundargerðir o.fl.
Sigurður Guðjón Jónsson	2	15.03.18	Samskipti, skipulag, fundur með arkitekt o.fl.
Sigurður Guðjón Jónsson	2	15.03.18	Samskipti, skipulag, fundur með verkkaupa o.fl.
Sigurður Guðjón Jónsson	1	16.03.18	Samskipti, skipulag o.fl.
Sigurður Guðjón Jónsson	1	19.03.18	Samskipti, skipulag o.fl.
Sigurður Guðjón Jónsson	1	20.03.18	Samskipti, skipulag, fundur o.fl.
Sigurður Guðjón Jónsson	1	21.03.18	Samskipti, skipulag, fundur, snið o.fl.
Sigurður Guðjón Jónsson	2	22.03.18	Samskipti, skipulag, fundur, snið o.fl.
Sigurður Guðjón Jónsson	3,5	23.03.18	Samskipti, skipulag, fundur, upplýsingaskilti, snið o.fl.
<i>Sigurður Guðjón Jónsson Alls</i>	<i>36,0</i>		
Eyjólfur Valgarðsson	2	20.03.18	Burðarþol - Fundir
Eyjólfur Valgarðsson	2	31.03.18	Fundur - Krókur - Teikningar
<i>Eyjólfur Valgarðsson Alls</i>	<i>4</i>		
Hönnun og gerð útboðsgagna-Stjórnun, samræming, fundir o.fl.	40,0		
Hönnun og gerð útboðsgagna-Burðarvirki, undirstöður o.fl.			
Björn Arnar Rafnsson	1	21.03.18	Teikningar
<i>Björn Arnar Rafnsson Alls</i>	<i>1</i>		
Eyjólfur Valgarðsson	3	20.02.18	Fundur-Hverfisgata 76 Undirbúningur
Eyjólfur Valgarðsson	4	26.02.18	Stálþil-Steypuforsendur
Eyjólfur Valgarðsson	8	13.03.18	Burðarþolshönnun
Eyjólfur Valgarðsson	4	15.03.18	Fundur með arkitekt og verkkaupa
Eyjólfur Valgarðsson	8	16.03.18	Burðarþolshönnun
Eyjólfur Valgarðsson	4	19.03.18	Burðarþol - Fundir
Eyjólfur Valgarðsson	6	20.03.18	Burðarþol - Fundir
Eyjólfur Valgarðsson	8	21.03.18	Burðarþol - Fundir
Eyjólfur Valgarðsson	8	22.03.18	Burðarþol - Fundir
Eyjólfur Valgarðsson	8	23.03.18	Burðarþol - Fundir
Eyjólfur Valgarðsson	8	26.03.18	Burðarþol-Teikningar
Eyjólfur Valgarðsson	4	28.03.18	Burðarþol-Teikningar
Eyjólfur Valgarðsson	6	31.03.18	Fundur - Krókur - Teikningar
<i>Eyjólfur Valgarðsson Alls</i>	<i>79</i>		
Hönnun og gerð útboðsgagna-Burðarvirki, undirstöður o.fl.	80		
Alls	120,0		

Reykjavíkurborg - eignasjóður
Fjármálaskrifst. Reykjavíkurb.
Borgartúni 12-14
105 Reykjavík



Reikningsfærir á viðskm. 570480-0149
Bókunardags. 31. mars 2018
Gjaldddagi 30. apríl 2018
Reikningsnr. SRB86140

Verk nr. 1.250.233 Viti við Sæbraut

Lýsing	Magn Mælieining	Ein.verð	Afsláttur %	Álag %	Alls
Undirbúningsvinna-Frumkostnaðarmat, stjórnun, samræming, fundir ofl.					
V01-001					
Rúnar Gísli Valdimarsson	5,5 KLST	19.750,00	10%		97.762
					97.762
Undirbúningsvinna-Vinnusvæðamerkingar V01-002					
Bjarni Rúnar Ingvarsson	4,5 KLST	16.500,00	10%		66.825
Hörður Bjarnason	12,0 KLST	19.750,00	10%		213.300
					280.125
Undirbúningsvinna-Grjótörn, snið o.fl V01-003					
Hrönn K. Sch. Hallgrímsdóttir	41,5 KLST	16.500,00	10%		616.275
Rúnar Gísli Valdimarsson	4,5 KLST	19.750,00	10%		79.988
					696.262
Alls	68,0 KLST				1.074.150
Annar kostnaður					
AZ-E58 Nissan Rafm.1	40,0 Kílómetrar	129,25			5.170
					5.170
Vinna og kostnaður					1.079.320
Heildar ISK án VSK					1.079.320
Vsk-upphæð					259.037
Samtals ISK með VSK					1.338.357

Banki Íslandsbanki
Bankanr. [REDACTED]
Kennitala 430572-0169

Unnir tímar

MANNVIT\ELVABR

Verkkaupi	Reykjavíkurborg - eignasjóður			
Verk	1.250.233	Viti við Sæbraut		
Starfsmaður	Tímar	Dags	Hvað gert	
Undirbúningsvinna-Frumkostnaðarmat, stjórnun, samræming, fundir ofl.				
Rúnar Gísli Valdimarsson	1	22.02.18	Fundur með SGJ og verktaka vegna gagna	
Rúnar Gísli Valdimarsson	1	15.03.18	Fundur með SGJ og ÞG	
Rúnar Gísli Valdimarsson	0,5	16.03.18	Yfirfara líkan með Hrönn	
Rúnar Gísli Valdimarsson	1	21.03.18	Fundur með SGJ, EV HKSH	
Rúnar Gísli Valdimarsson	2	23.03.18	Fundur með verkkaupa, yfirfara líkan ofl.	
<i>Rúnar Gísli Valdimarsson Alls</i>	<i>5,5</i>			
Undirbúningsvinna-Frumkostnaðarmat, stjórnun, samræming, fundir ofl.	5,5			
Undirbúningsvinna-Vinnusvæðamerkingar				
Bjarni Rúnar Ingvarsson	4,5	15.02.18	Hjáleiðir	
<i>Bjarni Rúnar Ingvarsson Alls</i>	<i>4,5</i>			
Hörður Bjarnason	2	20.02.18	Vinnusvæðamerkingar-Akandi	
Hörður Bjarnason	7	21.02.18	Vinnusvæðamerkingar-Akandi	
Hörður Bjarnason	3	22.02.18	Vinnusvæðamerkingar-Óvarðir	
<i>Hörður Bjarnason Alls</i>	<i>12</i>			
Undirbúningsvinna-Vinnusvæðamerkingar	16,5			
Undirbúningsvinna-Grjótörn, snið o.fl				
Hrönn K. Sch. Hallgrímsdóttir	7	23.02.18	3D model fyrir grjótvörn - Viti	
Hrönn K. Sch. Hallgrímsdóttir	8,5	26.02.18	3D model og þversnið	
Hrönn K. Sch. Hallgrímsdóttir	0,5	27.02.18	Viti snið	
Hrönn K. Sch. Hallgrímsdóttir	9	01.03.18	Nýtt 3D model og 3 þversnið	
Hrönn K. Sch. Hallgrímsdóttir	0,5	02.03.18	Yfirfara með arkitekt	
Hrönn K. Sch. Hallgrímsdóttir	1,5	06.03.18	Fundur utanhúss	
Hrönn K. Sch. Hallgrímsdóttir	4	08.03.18	Breytingar á grjótvörn	
Hrönn K. Sch. Hallgrímsdóttir	0,5	12.03.18	Yfirfara með Yrkir gögn	
Hrönn K. Sch. Hallgrímsdóttir	2	15.03.18	fundur ásamt uppfærslum	
Hrönn K. Sch. Hallgrímsdóttir	2	20.03.18	Fundur Rvkborg	
Hrönn K. Sch. Hallgrímsdóttir	1	21.03.18	innahúss fundur	
Hrönn K. Sch. Hallgrímsdóttir	3	22.03.18	innanhússfundur ásamt lagfæra snið og 3D model	
Hrönn K. Sch. Hallgrímsdóttir	2	23.03.18	Innanhússfundur ásamt laga snið og núverandi vörn	
<i>Hrönn K. Sch. Hallgrímsdóttir Alls</i>	<i>41,5</i>			
Rúnar Gísli Valdimarsson	4,5	22.03.18	Módel fyrir vita, fundur ofl.	
<i>Rúnar Gísli Valdimarsson Alls</i>	<i>4,5</i>			
Undirbúningsvinna-Grjótörn, snið o.fl	46,0			
Alls	68,0			

Reykjavíkurborg - eignasjóður
Fjármálaskrifst. Reykjavíkurb.
Borgartúni 12-14
105 Reykjavík

Sala - Reikningur
Bls. 1 af 2



MANNVIT

Reikningsfærast á viðskm. 570480-0149
Bókunardags. 31. maí 2018
Gjaldalagi 30. júní 2018
Reikningsnr. SRB87497

Verk nr. 1.250.233 Viti við Sæbraut

Lýsing	Magn	Mælieining	Ein.verð	Afsláttur %	Álag %	Alls
Hönnun og gerð útboðsgagna-Stjórnun, samræming, fundir o.fl. V02-001						
Andri Garðar Reynisson	6,0	KLST	16.500,00	10%		89.100
Sigurður Guðjón Jónsson	30,0	KLST	19.750,00	10%		533.250
Sigmar Knútsson	1,0	KLST	19.750,00	10%		17.775
Rúnar Gísli Valdimarsson	1,0	KLST	19.750,00	10%		17.775
Eyjólfur Valgarðsson	6,0	KLST	19.750,00	10%		106.650
						764.550
Hönnun og gerð útboðsgagna-Rafmagn, heimtaug og lýsing V02-003						
Andri Garðar Reynisson	23,5	KLST	16.500,00	10%		348.975
Sigmar Knútsson	42,5	KLST	19.750,00	10%		755.438
Styrmir Freyr Böðvarsson	1,0	KLST	16.500,00	10%		14.850
						1.119.262
Hönnun og gerð útboðsgagna-Burðarvirki, undirstöður o.fl. V02-002						
Eyjólfur Valgarðsson	20,0	KLST	19.750,00	10%		355.500
						355.500
Hönnun og gerð útboðsgagna-Snjóbræðsla V02-004						
Þórunn Gísladóttir	0,5	KLST	12.300,00	10%		5.535
Heiðar Jónsson	4,0	KLST	19.750,00	10%		71.100
						76.635
Hönnun og gerð útboðsgagna-Útboðsgögn V02-005						
Sigurður Guðjón Jónsson	22,5	KLST	19.750,00	10%		399.938
Sigmar Knútsson	8,0	KLST	19.750,00	10%		142.200
						542.138
Alls	166,0	KLST				2.858.085
Annar kostnaður						
BH-H38 NISSAN LEAF	20,0	Kílómetrar	129,25			2.585
Akstur	20,0	Kílómetrar	129,25			2.585
EP-P75 Nissan Leaf (U6)	10,0	Kílómetrar	129,25			1.292
Akstur	20,0	Kílómetrar	129,25			2.585
Akstur	20,0	Kílómetrar	129,25			2.585
						11.632
Vinna og kostnaður						2.869.718
Heildar ISK án VSK						2.869.718
Vsk-upphæð						688.732
Samtals ISK með VSK						3.558.450

Þessi reikningur er upprunninn í rafrænu bókhaldskerfi sem uppfyllir reglugerð nr. 505/2013
Athugasemdir skulu gerðar fyrir gjalddaga reiknings, annars telst hann réttur

Reykjavíkurborg - eignasjóður
Fjármálaskrifst. Reykjavíkurb.
Borgartúni 12-14
105 Reykjavík

Sala - Reikningur
Bls. 2 af 2



MANNVIT

Reikningsfærisk á viðskm. 570480-0149
Bókunardags. 31. maí 2018
Gjaldhagi 30. júní 2018
Reikningsnr. SRB87497

Verk nr. 1.250.233 Viti við Sæbraut

Lýsing	Magn	Mælieining	Ein.verð	Afsláttur %	Álag %	Alls
Banki	Íslandsbanki					
Bankanr.						
Kennitala	430572-0169					

Þessi reikningur er upprunninn í rafrænu bókhaldskerfi sem uppfyllir reglugerð nr. 505/2013
Athugasemdir skulu gerðar fyrir gjalddaga reiknings, annars telst hann réttur

Mannvit hf - Urðarhvarfi 6 - 203 Kópavogur - Sími 422 3000 - verkbokhald@mannvit.is - Kt. 4305720169 - Vsknr 11430

Unnir tímar

MANNVIT\ELVABR

Verkkaupi Verk	Reykjavíkurborg - eignasjóður 1.250.233	Víti við Sæbraut		
Starfsmaður	Tímar	Dags	Hvað gert	
Hönnun og gerð útboðsgagna-Stjórnun, samræming, fundir o.fl.				
Rúnar Gísli Valdimarsson	1	18.04.18	Hitta SGJ, verktaka og eftirlit á staðnum	
<i>Rúnar Gísli Valdimarsson Alls</i>	<i>1</i>			
Andri Garðar Reynisson	2	04.04.18	Fundur í Borgartúni (Víti við Sæbraut)	
Andri Garðar Reynisson	2	12.04.18	Fundur í Borgartúni vegna lýsingar í vita	
Andri Garðar Reynisson	2	18.04.18	Fundur með Ásdísi á Yrki vegna lýsingarmála	
<i>Andri Garðar Reynisson Alls</i>	<i>6</i>			
Sigmar Knútsson	1	23.04.18	fundur vegna snjóbræðslu	
<i>Sigmar Knútsson Alls</i>	<i>1</i>			
Sigurður Guðjón Jónsson	1,5	03.04.18	Samskipti, skipulag, stjórnun o.fl.	
Sigurður Guðjón Jónsson	5	04.04.18	Samskipti, skipulag, stjórnun, fundir o.fl.	
Sigurður Guðjón Jónsson	0,5	05.04.18	Samskipti, skipulag, stjórnun, o.fl.	
Sigurður Guðjón Jónsson	1,5	06.04.18	Samskipti, skipulag, stjórnun, o.fl.	
Sigurður Guðjón Jónsson	2,5	10.04.18	Samskipti, skipulag, stjórnun, fundir o.fl.	
Sigurður Guðjón Jónsson	0,5	11.04.18	Samskipti, skipulag, stjórnun o.fl.	
Sigurður Guðjón Jónsson	3,5	12.04.18	Samskipti, skipulag, stjórnun, fundur o.fl.	
Sigurður Guðjón Jónsson	2	13.04.18	Samskipti, skipulag, stjórnun, áætlun o.fl.	
Sigurður Guðjón Jónsson	0,5	16.04.18	Samskipti, skipulag, stjórnun, o.fl.	
Sigurður Guðjón Jónsson	2	17.04.18	Samskipti, skipulag, fundur o.fl.	
Sigurður Guðjón Jónsson	2	18.04.18	Samskipti, skipulag, stjórnun, fundur á verkstað, kostnaður o.fl.	
Sigurður Guðjón Jónsson	2	20.04.18	Samskipti, skipulag, stjórnun, útboðsögn, kostnaðaráætlun o.fl.	
Sigurður Guðjón Jónsson	2	23.04.18	Samskipti, skipulag, stjórnun, útboðsögn, kostnaðaráætlun o.fl.	
Sigurður Guðjón Jónsson	3,5	27.04.18	Samskipti, skipulag, stjórnun, útboðsögn, kostnaðaráætlun o.fl.	
Sigurður Guðjón Jónsson	1	28.04.18	Samskipti, skipulag, stjórnun, útboðsgögn, kostnaðaráætlun o.fl.	
<i>Sigurður Guðjón Jónsson Alls</i>	<i>30,0</i>			
Eyjólfur Valgarðsson	2	12.04.18	Fundir - Teikningar	
Eyjólfur Valgarðsson	2	17.04.18	Fundir - Teikningar	
Eyjólfur Valgarðsson	2	23.04.18	Fundir - Teikningar	
<i>Eyjólfur Valgarðsson Alls</i>	<i>6</i>			
Hönnun og gerð útboðsgagna-Stjórnun, samræming, fundir o.fl.	44,0			
Hönnun og gerð útboðsgagna-Burðarvirki, undirstöður o.fl.				
Eyjólfur Valgarðsson	6	12.04.18	Fundir - Teikningar	
Eyjólfur Valgarðsson	8	16.04.18	Fundir - Teikningar	
Eyjólfur Valgarðsson	6	17.04.18	Fundir - Teikningar	
<i>Eyjólfur Valgarðsson Alls</i>	<i>20</i>			
Hönnun og gerð útboðsgagna-Burðarvirki, undirstöður o.fl.	20			
Hönnun og gerð útboðsgagna-Rafmagn, heimtaug og lýsing				
Andri Garðar Reynisson	0,6	03.04.18	Samtal við Sigmar vegna fyrirhugaðrar lýsingar á vita	
Andri Garðar Reynisson	2	10.04.18	Vinna vegna lýsingar í vita. Mögulegar lausnir ásamt samtöl við birgja	
Andri Garðar Reynisson	2	10.04.18	Fundur hjá Yrki	
Andri Garðar Reynisson	3	19.04.18	Lýsingarhönnun, þrívíddarteikning og birtútreikningar	
Andri Garðar Reynisson	5	20.04.18	Lýsingarhönnun, þrívíddarteikning og birtútreikningar	
Andri Garðar Reynisson	1,3	22.04.18	'utfærslur á tillögum - tillögur sendar til arkitekta	
Andri Garðar Reynisson	1	23.04.18	Samskipti við arkitekta - tillögur valdar ásamt nýrri gerð lampa í punktalýsingu	
Andri Garðar Reynisson	2,7	23.04.18	Magntaka á búnaði til lýsingar + verðáætlun búnaðar	
Andri Garðar Reynisson	2,3	23.04.18	Samskipti innandyrna á tengilausnum.	
Andri Garðar Reynisson	1	23.04.18	Fundur vegna lýsingarmála og frágangs.	
Andri Garðar Reynisson	1	26.04.18	Samskipti innandyrna vegna tenginga á ledborðum og driverum.	
Andri Garðar Reynisson	1	27.04.18	Stöðufundur á verkinu	
Andri Garðar Reynisson	0,6	27.04.18	Samskipti innandyrna vegna stöðu mála	
<i>Andri Garðar Reynisson Alls</i>	<i>23,5</i>			
Sigmar Knútsson	6	03.04.18	Lýsing við vita	
Sigmar Knútsson	1	04.04.18	Teikning heimtaugar í vita	

Unnir tímar

MANNVIT\ELVABR

Verkkaupi	Reykjavíkurborg - eignasjóður			
Verk	1.250.233	Víti við Sæbraut		
Starfsmaður		Tímar	Dags	Hvað gert
Sigmar Knútsson		0,5	04.04.18	Fundur v/verkáætlunar hönnunar
Sigmar Knútsson		1	11.04.18	Athuganir v/raffæðingar snjóbræðslu
Sigmar Knútsson		1	12.04.18	Uppfærsla einlínummyndar v/snjóbr.
Sigmar Knútsson		5	23.04.18	Magntaka og kostnaðaráætlun lýsingar
Sigmar Knútsson		6	25.04.18	Raflagnateikningar
Sigmar Knútsson		7	26.04.18	Lýsing, teikningar
Sigmar Knútsson		7	27.04.18	Lýsing, teikningar
Sigmar Knútsson		7	30.04.18	Verklýsing, teikningar
Sigmar Knútsson		1	30.04.18	Fundur með verkkaupa v/lýsingar
<i>Sigmar Knútsson Alls</i>		<i>42,5</i>		
Styrmir Freyr Böðvarsson		1	23.04.18	Ráðgj.vegna hönnunar á lýsingu
<i>Styrmir Freyr Böðvarsson Alls</i>		<i>1</i>		
Hönnun og gerð útboðsgagna-Rafmagn, heimtaug og lýsing		67,0		
Hönnun og gerð útboðsgagna-Snjóbræðsla				
Þórunn Gísladóttir		0,5	23.04.18	Uppsetn. teikninga
<i>Þórunn Gísladóttir Alls</i>		<i>0,5</i>		
Heiðar Jónsson		1	23.04.18	Snjóbræðsla
Heiðar Jónsson		3	30.04.18	Fundur + útreikningar
<i>Heiðar Jónsson Alls</i>		<i>4</i>		
Hönnun og gerð útboðsgagna-Snjóbræðsla		4,5		
Hönnun og gerð útboðsgagna-Útboðsgögn				
Sigmar Knútsson		8	24.04.18	Magntaka og kostnaðaráætlun lýsingar
<i>Sigmar Knútsson Alls</i>		<i>8</i>		
Sigurður Guðjón Jónsson		1,5	18.04.18	Samskipti, skipulag, útboðsgögn, kostnaður o.fl.
Sigurður Guðjón Jónsson		3	19.04.18	Samskipti, skipulag, stjórnun, útboðsgögn, kostnaðaráætlun o.fl.
Sigurður Guðjón Jónsson		2,5	20.04.18	Samskipti, skipulag, stjórnun, útboðsgögn, kostnaðaráætlun o.fl.
Sigurður Guðjón Jónsson		3	22.04.18	Samskipti, skipulag, stjórnun, útboðsgögn, kostnaðaráætlun o.fl.
Sigurður Guðjón Jónsson		6	23.04.18	Samskipti, skipulag, stjórnun, útboðsgögn, kostnaðaráætlun o.fl.
Sigurður Guðjón Jónsson		1,5	24.04.18	Samskipti, skipulag, stjórnun, útboðsgögn, kostnaðaráætlun o.fl.
Sigurður Guðjón Jónsson		0,5	25.04.18	Samskipti, skipulag, stjórnun, útboðsgögn, kostnaðaráætlun o.fl.
Sigurður Guðjón Jónsson		1	26.04.18	Samskipti, skipulag, stjórnun, útboðsgögn, kostnaðaráætlun o.fl.
Sigurður Guðjón Jónsson		3,5	30.04.18	Samskipti, skipulag, stjórnun, útboðsgögn, kostnaðaráætlun o.fl.
<i>Sigurður Guðjón Jónsson Alls</i>		<i>22,5</i>		
Hönnun og gerð útboðsgagna-Útboðsgögn		30,5		
Alls		166,0		

Reykjavíkurborg - eignasjóður
Fjármálaskrifst. Reykjavíkurb.
Borgartúni 12-14
105 Reykjavík

Sala - Reikningur
Bls. 1 af 2



MANNVIT

Reikningsfærast á viðskm. 570480-0149
Bókunardags. 30. júní 2018
Gjaldtagi 30. júlí 2018
Reikningsnr. **SRB88131**

Verk nr. 1.250.233 Viti við Sæbraut

Lýsing	Magn Mælieining	Ein.verð	Afsláttur %	Álag %	Alls
Hönnun og gerð útboðsgagna-Stjórnun, samræming, fundir o.fl. V02-001					
Rúnar Gísli Valdimarsson	1,0 KLST	19.750,00	10%		17.775
Sigurður Guðjón Jónsson	13,5 KLST	19.750,00	10%		239.962
Sigmar Knútsson	2,0 KLST	19.750,00	10%		35.550
Andri Garðar Reynisson	3,1 KLST	17.500,00	10%		48.825
					342.112
Hönnun og gerð útboðsgagna-Burðarvirki, undirstöður o.fl. V02-002					
Björn Arnar Rafnsson	17,0 KLST	12.300,00	10%		188.190
Valdimar Örn Helgason	1,0 KLST	19.750,00	10%		17.775
Eyjólfur Valgarðsson	40,0 KLST	19.750,00	10%		711.000
					916.965
Hönnun og gerð útboðsgagna-Rafmagn, heimtaug og lýsing V02-003					
Sigmar Knútsson	40,5 KLST	19.750,00	10%		719.888
Þórunn Gísladóttir	5,0 KLST	12.300,00	10%		55.350
Andri Garðar Reynisson	8,5 KLST	17.500,00	10%		133.875
Pétur Jóhannesson	1,5 KLST	19.750,00	10%		26.662
					935.775
Hönnun og gerð útboðsgagna-Snjóbræðsla V02-004					
Þórunn Gísladóttir	20,0 KLST	12.300,00	10%		221.400
Heiðar Jónsson	7,5 KLST	19.750,00	10%		133.312
Eggert Aðalsteinsson	0,5 KLST	19.750,00	10%		8.888
					363.600
Hönnun og gerð útboðsgagna-Útboðsgögn V02-005					
Rúnar Gísli Valdimarsson	9,0 KLST	19.750,00	10%		159.975
Sigurður Guðjón Jónsson	47,0 KLST	19.750,00	10%		835.425
Sighvatur Óttarr Elefsen	0,5 KLST	19.750,00	10%		8.888
Sigmar Knútsson	4,5 KLST	19.750,00	10%		79.988
Hrönn K. Sch. Hallgrímsdóttir	4,0 KLST	17.500,00	10%		63.000
Andri Garðar Reynisson	3,0 KLST	17.500,00	10%		47.250
					1.194.525
Alls	229,1 KLST				3.752.978
Vinna og kostnaður					3.752.978
Heildar ISK án VSK					3.752.978
Vsk-upphæð					900.715
Samtals ISK með VSK					4.653.692

Þessi reikningur er upprunninn í rafrænu bókhaldskerfi sem uppfyllir reglugerð nr. 505/2013
Athugasemdir skulu gerðar fyrir gjalddaga reiknings, annars telst hann réttur

Reykjavíkurborg - eignasjóður
Fjármálaskrifst. Reykjavíkurb.
Borgartúni 12-14
105 Reykjavík

Sala - Reikningur
Bls. 2 af 2



MANNVIT

Reikningsfæriskrá á viðskm. 570480-0149
Bókunardags. 30. júní 2018
Gjaldalagi 30. júlí 2018
Reikningsnr. SRB88131

Verk nr. 1.250.233 Viti við Sæbraut

Lýsing	Magn	Mælieining	Ein.verð	Afsláttur %	Álag %	Alls
Banki	Íslandsbanki					
Bankanr.						
Kennitala	430572-0169					

Þessi reikningur er upprunninn í rafrænu bókhaldskerfi sem uppfyllir reglugerð nr. 505/2013
Athugasemdir skulu gerðar fyrir gjalddaga reiknings, annars telst hann réttur

Mannvit hf - Urðarhvarfi 6 - 203 Kópavogur - Sími 422 3000 - verkbofhald@mannvit.is - Kt. 4305720169 - Vsknr 11430

Unnir tímar

MANNVIT\ASLAUG

Verkkaupi Verk	Reykjavíkurborg - eignasjóður 1.250.233	Viti við Sæbraut		
Starfsmaður	Tímar	Dags	Hvað gert	
Hönnun og gerð útboðsgagna-Stjórnun, samræming, fundir o.fl.				
Rúnar Gísli Valdimarsson	1	11.05.18	Yfirferð teikningar	
<i>Rúnar Gísli Valdimarsson Alls</i>	<i>1</i>			
Andri Garðar Reynisson	1,5	03.05.18	Fundur vegna lýsingar	
Andri Garðar Reynisson	1,6	09.05.18	Fundur í hafnarhúsi með faxaflóarhöfnum og arkitekt	
<i>Andri Garðar Reynisson Alls</i>	<i>3,1</i>			
Sigmar Knútsson	1	03.05.18	Fundur v/lýsingar	
Sigmar Knútsson	1	09.05.18	Fundur með Faxaflóahöfnum v/lýsingar	
<i>Sigmar Knútsson Alls</i>	<i>2</i>			
Sigurður Guðjón Jónsson	0,5	02.05.18	Samskipti, skipulag, útboðsgögn o.fl.	
Sigurður Guðjón Jónsson	3	03.05.18	Samskipti, skipulag, fundir, útboðsgögn o.fl.	
Sigurður Guðjón Jónsson	2	04.05.18	Samskipti, skipulag, fundir, útboðsgögn o.fl.	
Sigurður Guðjón Jónsson	2,5	09.05.18	Samskipti, skipulag, fundur, útboðsgögn o.fl.	
Sigurður Guðjón Jónsson	1	22.06.18	Uppgjörsmál o.fl.	
Sigurður Guðjón Jónsson	1,5	26.06.18	Fundur með ÞG, samningsmál, uppgjör o.fl.	
Sigurður Guðjón Jónsson	2	27.06.18	Fundur með verkkaupa, eftirliti og arkitekt, undirbúningur fyrir upphaf framkv.	
Sigurður Guðjón Jónsson	1	28.06.18	Fundur með hönnuðum varðandi að leggja inn teikningar til bygg.fulltrúa o.fl.	
<i>Sigurður Guðjón Jónsson Alls</i>	<i>13,5</i>			
Hönnun og gerð útboðsgagna-Stjórnun, samræming, fundir o.fl.	19,6			
Hönnun og gerð útboðsgagna-Burðarvirki, undirstöður o.fl.				
Valdimar Örn Helgason	1	14.05.18	Rýni teikninga	
<i>Valdimar Örn Helgason Alls</i>	<i>1</i>			
Björn Arnar Rafnsson	2	04.05.18	Teikningar	
Björn Arnar Rafnsson	10	07.05.18	Teikningar	
Björn Arnar Rafnsson	1	08.05.18	Teikningar	
Björn Arnar Rafnsson	4	09.05.18	Teikningar	
<i>Björn Arnar Rafnsson Alls</i>	<i>17</i>			
Eyjólfur Valgarðsson	6	06.04.18	Teikningar - snið	
Eyjólfur Valgarðsson	5	07.05.18	Burðarþolsteikningar	
Eyjólfur Valgarðsson	5	08.05.18	Burðarþolsteikningar	
Eyjólfur Valgarðsson	5	09.05.18	Burðarþolsteikningar	
Eyjólfur Valgarðsson	8	11.05.18	Burðarþolsteikningar	
Eyjólfur Valgarðsson	8	14.05.18	Burðarþolsteikningar	
Eyjólfur Valgarðsson	3	23.05.18	Stálrör í stað steyptra staura	
<i>Eyjólfur Valgarðsson Alls</i>	<i>40</i>			
Hönnun og gerð útboðsgagna-Burðarvirki, undirstöður o.fl.	58			
Hönnun og gerð útboðsgagna-Rafmagn, heimtaug og lýsing				
Þórunn Gísladóttir	2	08.05.18	Rafmagn	
Þórunn Gísladóttir	3	30.06.18	Rafmagn	
<i>Þórunn Gísladóttir Alls</i>	<i>5</i>			
Andri Garðar Reynisson	2	02.05.18	Samskipti við arkitekta, fyrirspegnir til birgja	
Andri Garðar Reynisson	1	03.05.18	Upplýsingaöflun um nýjar útfærslur á lýsingu, undirbúningur fyrir fund með ark.	
Andri Garðar Reynisson	1	03.05.18	Upplýsingaöflun um nýjar útfærslur á lýsingu	
Andri Garðar Reynisson	1	04.05.18	Stöðufundur	
Andri Garðar Reynisson	1	04.05.18	Samskipti við birgja, verð og fyrirspegnir vegna frágangs á lýsingu	
Andri Garðar Reynisson	1	08.05.18	Samskipti vegna lýsngarmála	
Andri Garðar Reynisson	0,5	09.05.18	Stöðufundur á verkinu	
Andri Garðar Reynisson	1	09.05.18	Samskipti innandyra og við birgja vegna lýsingar	
<i>Andri Garðar Reynisson Alls</i>	<i>8,5</i>			
Sigmar Knútsson	9	02.05.18	Einlínnumyndir, stýriteikningar fyrir lýsingu	
Sigmar Knútsson	4	03.05.18	Teikningar v/lýsingar	

Unnir tímar

Verkkaupi Verk	Reykjavíkurborg - eignasjóður 1.250.233	Víti við Sæbraut		
Starfsmaður	Tímar	Dags	Hvað gert	
Sigmar Knútsson	7	04.05.18	Teikningar v/lýsingar	
Sigmar Knútsson	11	07.05.18	Teikningar v/lýsingar	
Sigmar Knútsson	9	08.05.18	Teikningar v/lýsingar	
Sigmar Knútsson	0,5	28.06.18	Fundur v/skila á teikningum til byggingarfulltrúa	
<i>Sigmar Knútsson Alls</i>	<i>40,5</i>			
Pétur Jóhannesson	1,5	08.05.18	Yfirferð og rýni á teikningar	
<i>Pétur Jóhannesson Alls</i>	<i>1,5</i>			
Hönnun og gerð útboðsgagna-Rafmagn, heimtaug og lýsing	55,5			
Hönnun og gerð útboðsgagna-Snjóbræðsla				
Þórunn Gísladóttir	5,5	03.05.18	Snjóbræðsla	
Þórunn Gísladóttir	6,5	04.05.18	Snjóbræðsla	
Þórunn Gísladóttir	6,5	07.05.18	Snjóbræðsla	
Þórunn Gísladóttir	1,5	08.05.18	Snjóbræðsla	
<i>Þórunn Gísladóttir Alls</i>	<i>20,0</i>			
Eggert Aðalsteinsson	0,5	28.06.18	Samræmingarfundur	
<i>Eggert Aðalsteinsson Alls</i>	<i>0,5</i>			
Heiðar Jónsson	3,5	04.05.18	Hönnun, kerfism. fundur	
Heiðar Jónsson	3	09.05.18	Fundur. Snjóbræðsla	
Heiðar Jónsson	1	11.05.18	...	
<i>Heiðar Jónsson Alls</i>	<i>7,5</i>			
Hönnun og gerð útboðsgagna-Snjóbræðsla	28,0			
Hönnun og gerð útboðsgagna-Útboðsgögn				
Hrönn K. Sch. Hallgrímsdóttir	2	09.05.18	Yfirborðsteikning af svæði	
Hrönn K. Sch. Hallgrímsdóttir	1	11.05.18	Leiðrétting á teikningu	
Hrönn K. Sch. Hallgrímsdóttir	1	14.05.18	Lagfæra teikningu og setja saman teikningasett, teikningaskrá uppfærð	
<i>Hrönn K. Sch. Hallgrímsdóttir Alls</i>	<i>4</i>			
Sighvatur Óttarr Elefsen	0,5	14.05.18	Aðstoð við RGV, vegna málningarlýsingar.	
<i>Sighvatur Óttarr Elefsen Alls</i>	<i>0,5</i>			
Rúnar Gísli Valdimarsson	3	13.05.18	Yfirferð útboðsgagna og tilboðsskrár	
Rúnar Gísli Valdimarsson	5	14.05.18	Lagfæringar á útboðsgögnum, samskipti við arkitekt, senda gögn	
Rúnar Gísli Valdimarsson	1	29.05.18	Yfirfara kostnaðaráætlun	
<i>Rúnar Gísli Valdimarsson Alls</i>	<i>9</i>			
Andri Garðar Reynisson	3	11.05.18	Verklýsing, magntölur og spekkar	
<i>Andri Garðar Reynisson Alls</i>	<i>3</i>			
Sigmar Knútsson	2	10.05.18	Útboðsgögn	
Sigmar Knútsson	2	12.05.18	Útboðsgögn	
Sigmar Knútsson	0,5	29.05.18	Magnskrá rafmagns	
<i>Sigmar Knútsson Alls</i>	<i>4,5</i>			
Sigurður Guðjón Jónsson	4	06.05.18	Samskipti, skipulag, útboðsgögn o.fl.	
Sigurður Guðjón Jónsson	3,5	07.05.18	Samskipti, skipulag, útboðsgögn o.fl.	
Sigurður Guðjón Jónsson	8	08.05.18	Samskipti, skipulag, útboðsgögn o.fl.	
Sigurður Guðjón Jónsson	7	09.05.18	Samskipti, skipulag, útboðsgögn o.fl.	
Sigurður Guðjón Jónsson	6	10.05.18	Samskipti, skipulag, útboðsgögn o.fl.	
Sigurður Guðjón Jónsson	9,5	11.05.18	Samskipti, skipulag, útboðsgögn o.fl.	
Sigurður Guðjón Jónsson	2	12.05.18	Samskipti, skipulag, útboðsgögn o.fl.	
Sigurður Guðjón Jónsson	4	13.05.18	Samskipti, skipulag, útboðsgögn o.fl.	
Sigurður Guðjón Jónsson	2	29.05.18	Samskipti, skipulag, kostnaðaráætlun o.fl.	
Sigurður Guðjón Jónsson	1	30.05.18	Samskipti, skipulag, kostnaðaráætlun o.fl.	
<i>Sigurður Guðjón Jónsson Alls</i>	<i>47,0</i>			
Hönnun og gerð útboðsgagna-Útboðsgögn	68,0			
Alls	229,1			

Reykjavíkurborg - eignasjóður
Fjármálaskrifst, Reykjavíkurb.
Borgartúni 12-14
105 Reykjavík

Sala - Reikningur
Bls. 1 af 1



MANNVIT

Reikningsfærir á viðskm. 570480-0149
Bókunardags. 31. júlí 2018
Gjaldddagi 30. ágúst 2018
Reikningsnr. SRB88541

Verk nr. 1.250.233 Viti við Sæbraut

Lýsing	Magn Mælieining	Ein.verð	Afsláttur %	Álag %	Alls
Hönnun og gerð útboðsgagna-Stjórnun, samræming, fundir o.fl. V02-001					
Sigurður Guðjón Jónsson	10,0 KLST	19.750,00	10%		177.750
Þorvaldur Kári Vilhjálmsson	2,0 KLST	10.700,00	10%		19.260
Emil Haraldsson	1,0 KLST	13.300,00	10%		11.970
					208.980
Hönnun og gerð útboðsgagna-Burðarvirki, undirstöður o.fl. V02-002					
Eyjólfur Valgarðsson	5,0 KLST	19.750,00	10%		88.875
					88.875
Hönnun og gerð útboðsgagna-Rafmagn, heimtaug og lýsing V02-003					
Sigmar Knútsson	3,5 KLST	19.750,00	10%		62.212
Þórunn Gísladóttir	2,0 KLST	12.300,00	10%		22.140
Pétur Jóhannesson	1,0 KLST	19.750,00	10%		17.775
					102.128
Hönnun og gerð útboðsgagna-Snjóbræðsla V02-004					
Sigurður Ingi Þorleifsson	0,5 KLST	19.750,00	10%		8.888
Þórunn Gísladóttir	3,5 KLST	12.300,00	10%		38.745
					47.632
Hönnun og gerð útboðsgagna-Þjónusta á framkv.tíma, útsetningargögn o.fl. V02-006					
Ævar Valgeirsson	6,5 KLST	16.500,00	10%		96.525
					96.525
Alls	35,0 KLST				544.140

Vinna og kostnaður 544.140

Heildar ISK án VSK 544.140
Vsk-upphæð 130.594
Samtals ISK með VSK 674.734

Banki Íslandsbanki
Banknr. [REDACTED]
Kennitala 430572-0169

Fylgiskjöl með reikningi:
SRB885411 - SRB88541-50014.PDF

Þessi reikningur er upprunninn í rafrænu bókhaldskerfi sem uppfyllir reglugerð nr. 505/2013
Athugasemdir skulu gerðar fyrir gjaldddaga reiknings, annars telst hann réttur

Mannvit hf - Urðarhvarfi 6 - 203 Kópavogur - Sími 422 3000 - verkbokehald@mannvit.is - Kt. 4305720169 - Vsknr 11430

Unnir tímar

MANNVIT\ANNA

Verkkaupi Verk	Reykjavíkurborg - eignasjóður 1.250.233 Viti við Sæbraut			
Starfsmaður	Tímar	Dags	Hvað gert	
Hönnun og gerð útboðsgagna-Stjórnun, samræming, fundir o.fl.				
Þorvaldur Kári Vilhjálmsson	2	17.07.18	Fá undirskriftir frá arkitekt og skila inn teikningum til byggingarfulltrúa	
<i>Þorvaldur Kári Vilhjálmsson Alls</i>	2			
Sigurður Guðjón Jónsson	5,5	04.07.18	Fundur með verkkaupa og eftirliti, skil teikninga til bygg.fulltr.	
Sigurður Guðjón Jónsson	1	05.07.18	Skil teikninga til byggingarfulltrúa, rýni samræming o.fl.	
Sigurður Guðjón Jónsson	1,5	06.07.18	Samræming, teikningar, verklýsingar, magntölur o.fl	
Sigurður Guðjón Jónsson	2	10.07.18	Fundur með verkkaupa, eftirliti og verktaka	
<i>Sigurður Guðjón Jónsson Alls</i>	10,0			
Emil Haraldsson	1	03.07.18	fnt	
<i>Emil Haraldsson Alls</i>	1			
Hönnun og gerð útboðsgagna-Stjórnun, samræming, fundir o.fl.	13,0			
Hönnun og gerð útboðsgagna-Burðarvirki, undirstöður o.fl.				
Eyjólfur Valgarðsson	4	31.07.18	Breytingar á teikningum vegna stálröra	
Eyjólfur Valgarðsson	1	31.07.18	Prentun og áritun teikninga	
<i>Eyjólfur Valgarðsson Alls</i>	5			
Hönnun og gerð útboðsgagna-Burðarvirki, undirstöður o.fl.	5			
Hönnun og gerð útboðsgagna-Rafmagn, heimtaug og lýsing				
Þórunn Gísladóttir	0,5	04.07.18	Snjóbræðsla	
Þórunn Gísladóttir	0,5	04.07.18	Rafmagn	
Þórunn Gísladóttir	0,5	06.07.18	Endanlegur frágangur teikn. til Byggingafulltrúa	
Þórunn Gísladóttir	0,5	06.07.18	Endanlegur frágangur teikn. til Byggingafulltrúa	
<i>Þórunn Gísladóttir Alls</i>	2,0			
Sigmar Knútsson	1,5	04.07.18	Uppfærsla teikninga samkv. rýni	
Sigmar Knútsson	1	09.07.18	Yfirfarnar upplýsingar yfir efni til samþykktar	
Sigmar Knútsson	1	10.07.18	Samskipti við verktaka v/efnissamþykktar	
<i>Sigmar Knútsson Alls</i>	3,5			
Pétur Jóhannesson	0,5	05.07.18	Rýna og undirrita teikningar	
Pétur Jóhannesson	0,5	06.07.18	Rýna og undirrita teikningar	
<i>Pétur Jóhannesson Alls</i>	1,0			
Hönnun og gerð útboðsgagna-Rafmagn, heimtaug og lýsing	6,5			
Hönnun og gerð útboðsgagna-Snjóbræðsla				
Þórunn Gísladóttir	1	02.07.18	Útgáfa teikn. til BFR	
Þórunn Gísladóttir	2,5	05.07.18	Snjóbræðsla	
<i>Þórunn Gísladóttir Alls</i>	3,5			
Sigurður Ingi Þorleifsson	0,5	05.07.18	Rýni á teikningum	
<i>Sigurður Ingi Þorleifsson Alls</i>	0,5			
Hönnun og gerð útboðsgagna-Snjóbræðsla	4,0			
Hönnun og gerð útboðsgagna-Þjónusta á framkv.tíma, útsetningargögn o.fl.				
Ævar Valgeirsson	1	23.07.18	Útbúa útsetningargögn	
Ævar Valgeirsson	2,5	24.07.18	Útbúa útsetningargögn	
Ævar Valgeirsson	3	25.07.18	Útbúa útsetningargögn	
<i>Ævar Valgeirsson Alls</i>	6,5			
Hönnun og gerð útboðsgagna-Þjónusta á framkv.tíma, útsetningargögn o.fl.	6,5			
Alls	35,0			

Reykjavíkurborg - eignasjóður
Verkb.nr. 153143
Fjármálaskrifst. Reykjavíkurb.
Borgartúni 12-14
105 Reykjavík

Sala - Reikningur
Bls. 1 af 1



MANNVIT

Reikningsfæriskrá á viðskm. 570480-0149
Bókunardags. 31. ágúst 2018
Gjaldlagi 30. september 2018
Reikningsnr. SRB89034

Verk nr. 1.250.233 Viti við Sæbraut

Lýsing	Magn Mælieining	Ein.verð	Afsláttur %	Álag %	Alls
Hönnun og gerð útboðsgagna-Stjórnun, samræming, fundir o.fl. V02-001					
Sigurður Guðjón Jónsson	8,5 KLST	19.750,00	10%		151.088
					151.088
Hönnun og gerð útboðsgagna-Burðarvirki, undirstöður o.fl. V02-002					
Eyjólfur Valgarðsson	4,0 KLST	19.750,00	10%		71.100
Gunnar Dór Karlsson	4,5 KLST	13.300,00	10%		53.865
Torfi Guðmundur Sigurðsson	1,0 KLST	21.150,00	10%		19.035
					144.000
Hönnun og gerð útboðsgagna-Þjónusta á framkv. tíma, útsetningargögn o.fl. V02-006					
Sigurður Guðjón Jónsson	3,5 KLST	19.750,00	10%		62.212
Ævar Valgeirsson	0,5 KLST	16.500,00	10%		7.425
					69.638
Alls	22,0 KLST				364.725
Vinna og kostnaður					364.725
Heildar ISK án VSK					364.725
Vsk-upphæð					87.534
Samtals ISK með VSK					452.259

Banki Íslandsbanki
Bankanr. [REDACTED]
Kennitala 430572-0169

Fylgiskjöl með reikningi:
SRB890341 - SRB89034-50014.PDF

Þessi reikningur er upprunninn í rafrænu bókhaldskerfi sem uppfyllir reglugerð nr. 505/2013
Athugasemdir skulu gerðar fyrir gjalddaga reiknings, annars telst hann réttur

Mannvit hf - Urðarhvarfi 6 - 203 Kópavogur - Sími 422 3000 - verkbokehald@mannvit.is - Kt. 4305720169 - Vsknr 11430

Unnir tímar

MANNVIT\ASLAUG

Verkkaupi	Reykjavíkurborg - eignasjóður			
Verk	1.250.233	Víti við Sæbraut		
Starfsmaður	Tímar	Dags	Hvað gert	
Hönnun og gerð útboðsgagna-Stjórnun, samræming, fundir o.fl.				
Sigurður Guðjón Jónsson	2	01.08.18	Samskipti, skipulag, samræming, hæðarsetning o.fl.	
Sigurður Guðjón Jónsson	1,5	02.08.18	Samskipti, skipulag, samræming, hæðarsetning o.fl.	
Sigurður Guðjón Jónsson	2,5	09.08.18	Samskipti, skipulag, samræming teikninga, nýjar teikningar o.fl.	
Sigurður Guðjón Jónsson	1	15.08.18	Samskipti, skipulag, fundur, uppfærsla teikninga o.fl.	
Sigurður Guðjón Jónsson	0,5	27.08.18	Samskipti, samræming, niðurföll o.fl.	
Sigurður Guðjón Jónsson	1	29.08.18	Samskipti, samræming, niðurföll o.fl.	
<i>Sigurður Guðjón Jónsson Alls</i>	8,5			
Hönnun og gerð útboðsgagna-Stjórnun, samræming, fundir o.fl.	8,5			
Hönnun og gerð útboðsgagna-Burðarvirki, undirstöður o.fl.				
Gunnar Dór Karlsson	2	10.08.18	Lagfæringar á undirstöðum	
Gunnar Dór Karlsson	2,5	15.08.18	Lagfæringar á undirstöðum	
<i>Gunnar Dór Karlsson Alls</i>	4,5			
Torfi Guðmundur Sigurðsson	1	09.08.18	Aðstoða SGJ við lausnir	
<i>Torfi Guðmundur Sigurðsson Alls</i>	1			
Eyjólfur Valgarðsson	2	15.08.18	Burðarþol	
Eyjólfur Valgarðsson	2	17.08.18	Rýni á teikningu v. breytinga	
<i>Eyjólfur Valgarðsson Alls</i>	4			
Hönnun og gerð útboðsgagna-Burðarvirki, undirstöður o.fl.	9,5			
Hönnun og gerð útboðsgagna-Þjónusta á framkv. tíma, útsetningargögn o.fl.				
Ævar Valgeirsson	0,5	01.08.18	Útsetningargögn	
<i>Ævar Valgeirsson Alls</i>	0,5			
Sigurður Guðjón Jónsson	1,5	07.08.18	Samskipti, skipulag, samræming, hæðarsetning o.fl.	
Sigurður Guðjón Jónsson	2	08.08.18	Samskipti, skipulag, samræming, hæðarsetning o.fl.	
<i>Sigurður Guðjón Jónsson Alls</i>	3,5			
Hönnun og gerð útboðsgagna-Þjónusta á framkv. tíma, útsetningargögn o.fl.	4,0			
Alls	22,0			

Reykjavíkurborg - eignasjóður
Verkb.nr. 153143
Fjármálaskrifst. Reykjavíkurb.
Borgartúni 12-14
105 Reykjavík

Sala - Reikningur
Bl. 1 af 1



MANNVIT

Reikningsfærir á viðskm. 570480-0149
Bókunardags. 30. september 2018
Gjaldlagi 30. október 2018
Reikningsnr. **SRB89584**

Verk nr. 1.250.233 Viti við Sæbraut

Lýsing	Magn Mælieining	Ein.verð	Afsláttur %	Álag %	Alls
Hönnun og gerð útboðsgagna-þjónusta á framkv.tíma, útsetningargögn o.fl. V02-006					
Andri Ísak Þórhallsson	0,5 KLST	18.150,00	10%		8.168
Sigurður Guðjón Jónsson	1,5 KLST	19.750,00	10%		26.662
					34.830
Alls	2,0 KLST				34.830
Vinna og kostnaður					34.830
Heildar ISK án VSK					34.830
Vsk-upphæð					8.359
Samtals ISK með VSK					43.189

Banki Íslandsbanki
Bankanr. 
Kennitala 430572-0169

Fylgiskjöl með reikningi:
SRB895841 - SRB89584-50014.PDF

Þessi reikningur er upprunninn í rafrænu bókhaldskerfi sem uppfyllir reglugerð nr. 505/2013
Athugasemdir skulu gerðar fyrir gjalddaga reiknings, annars telst hann réttur

Mannvit hf - Urðarhvarfi 6 - 203 Kópavogur - Sími 422 3000 - verkboald@mannvit.is - Kt. 4305720169 - Vsknr 11430

Unnir tímar

Verkkaupi	Reykjavíkurborg - eignasjóður	
Verk	1.250.233	Víti við Sæbraut

Starfsmaður	Tímar	Dags	Hvað gert
Hönnun og gerð útboðsgagna-þjónusta á framkv.tíma, útsetningargögn o.fl.			
Andri Ísak Þórhallsson	0,5	13.09.18	Málningarkerfi - verklýsing og tillaga frá Sérefnum
Andri Ísak Þórhallsson Alls	0,5		
Sigurður Guðjón Jónsson	0,5	12.09.18	Samskipti á framkvæmdatíma o.fl.
Sigurður Guðjón Jónsson	0,5	14.09.18	Samskipti á framkvæmdatíma o.fl.
Sigurður Guðjón Jónsson	0,5	20.09.18	Samskipti o.fl. á framkvæmdatím
Sigurður Guðjón Jónsson Alls	1,5		
Hönnun og gerð útboðsgagna-þjónusta á framkv.tíma, útsetningargögn o.fl.	2,0		
Alls	2,0		

Reykjavíkurborg - eignasjóður
Verkb.nr. 153143
Fjármálaskrifst. Reykjavíkurb.
Borgartúni 12-14
105 Reykjavík

Sala - Reikningur
Bls. 1 af 1



MANNVIT

Reikningsfærisk á viðskm. 570480-0149
Bókunardags. 31. október 2018
Gjaldalagi 30. nóvember 2018
Reikningsnr. SRB90034

Verk nr. 1.250.233 Viti við Sæbraut

Lýsing	Magn Mælieining	Ein.verð	Afsláttur %	Álag %	Alls
Hönnun og gerð útboðsgagna-þjónusta á framkv.tíma, útsetningargögn o.fl. V02-006					
Sigurður Guðjón Jónsson	0,5 KLST	19.750,00	10%		8.888
Sigmar Knútsson	1,0 KLST	19.750,00	10%		17.775
					26.662
Alls	1,5 KLST				26.662

Vinna og kostnaður

26.662

Heildar ISK án VSK 26.662
Vsk-upphæð 6.399
Samtals ISK með VSK 33.062

Banki Íslandsbanki
Bankanr. [REDACTED]
Kennitala 430572-0169

Fylgiskjöl með reikningi:

SRB900341 - SRB90034-50014.PDF

Þessi reikningur er upprunninn í rafrænu bókhaldskerfi sem uppfyllir reglugerð nr. 505/2013
Athugasemdir skulu gerðar fyrir gjalddaga reiknings, annars telst hann réttur

Mannvit hf - Urðarhvarfi 6 - 203 Kópavogur - Sími 422 3000 - verkbokehald@mannvit.is - Kt. 4305720169 - Vsknr 11430

Unnir tímar

MANNVIT\ASLAUG

Verkkaupi	Reykjavíkurborg - eignasjóður		
Verk	1.250.233	Viti við Sæbraut	

Starfsmaður	Tímar	Dags	Hvað gert
Hönnun og gerð útboðsgagna-þjónusta á framkv.tíma, útsetningargögn o.fl.			
Sigmar Knútsson	1	23.10.18	Fyrirspurn rafverktaka v/lýsingar
<i>Sigmar Knútsson Alls</i>	<i>1</i>		
Sigurður Guðjón Jónsson	0,5	30.10.18	Samskipti, svara fyrirspurnum verktaka o.fl.
<i>Sigurður Guðjón Jónsson Alls</i>	<i>0,5</i>		
Hönnun og gerð útboðsgagna-þjónusta á framkv.tíma, útsetningargögn o.fl.	1,5		
Alls	1,5		

MÓTTÆKIÐ 15/02/2018

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar
Fjárm.skrifstofa Reykjavíkur.
Borgartúni 12-14
105 Reykjavík
Pór Gunnarsson

Sala - Reikningur
Bl. 1 af 1




MANNVÍT

Reikningsfærisk á viðskm. 530269-7609
Bókunardags. 31.1.2018
Gjaldldagi 2.3.2018
Reikningsnr. SRB85002

Verk nr. 1.250.233 - Viti við Sæbraut

Lýsing	Magn	Mælieining	Ein.verð	Afsláttur%	Álag %	Alls
000-000						
Bjarni Rúnar Ingvarsson	11	KLST	16.500	10		163.350
Guðmundur Jónasson	1	KLST	19.750	10		17.775
Rúnar Gísli Valdimarsson	1	KLST	19.750	10		17.775
Sigurður Guðjón Jónsson	26	KLST	19.750	10		462.150
						661.050
Alls	39	KLST				661.050
Annar kostnaður						
Akstur	20	Kílómetrar	118		10	2.585
BH-H38 NISSAN LEAF	20	Kílómetrar	118		10	2.585
						5.170
Vinna og kostnaður						666.220
					Heildar ISK án VSK	666.220
					VSK-upphæð	159.893
					Samtals ISK með VSK	826.113

Banki Íslandsbanki
Bankanr. [REDACTED]
Kennitala 4305720169



Þessi reikningur er upprunninn í rafrænu bókhaldskerfi sem uppfyllir reglugerð nr. 505/2013
Athugasemdir skulu gerðar fyrir gjalddaga reiknings, annars telst hann réttur.

Mannvít hf - Urðarhvarfi 6 - 203 Kópavogur - Sími 422 3000 - verkbokehald@mannvit.is - Rt. 4305720169 - VSKnr. 11430

Móttækid 25/04/2018

VSO RÁÐGJAF

FRAMKV.SVIÐ RVK, USK, RÁÐHÚS
Þór Gunnarsson
BORGARBÓKHALD TJARNARGÖTU 11
101 REYKJAVÍK

Reikningur

Kennitala 6812720979
Vsk nr. 15519
Bankanr. [REDACTED]


Reikningsnúmer R1211169
Reikn.færir á viðskm. 570480-0149
Bókunardags. 31.3.2018
Gjaldddagi 20.4.2018

Verk nr. 18156

Viti við Sæbraut - Eftirlit/verkbeiðnanúmer 153144

Þóknun Skv. Meðfylgjandi Skilagrein

Samtals án VSK 363.300
VSK-upphæð 87.192
Samtals með VSK 450.492



Þessi reikningur er upprunninn í bókhalds- og áætlunarkerfi sem er sniðið eftir reglugerð nr. 505/2013

Borgatún 20, 105 Reykjavík
Sími: 5859000, Fax: 5859010
Netfang: vso@vso.is
Heimasíða: www.vso.is

Vinsamlegast athugið, reikningar greiðist innan 20 daga frá dagsetningu reiknings.

Móttækid 16/05/2018

Yrki arkitektar ehf

Kt.: 560997-3109 Vsk-númer: 55547

REIKNINGUR

Reikningur nr. 0001936

Umhverfis- og skipulagssvið
Borgartúni 12-14

105 Reykjavík

Kt. 570480-0149

Vörumóttakandi
Umhverfis- og skipulagssvið
Borgartúni 12-14

105 Reykjavík

Viðskiptanúmer 5704800149
Dagsetning 30.04.2018

Gjaldddagi 30.04.2018
Eindagi 30.04.2018

Þjónusta	Magn	Ein.verð	Upphæð
Vinna ráðgjafa við hönnun vita við Höfða gerðar voru verkefningar, verklýsingar og kostnaðaráætlun			
Þjónusta - Arkitekt 1	42,00	18.645	783.090
Þjónusta - Arkitekt 2	130,00	17.765	2.309.450
Upphæð án vsk.			3.092.540
Vsk. upphæð			742.210
Samtals ISK með vsk.			3.834.750
Sundurliðun vsk. upphæðar			
VSK 24.0%		3.092.540	742.210

Vinsamlega leggið inn á reikning Yrki arkitekta ehf.
Landsbanki Íslands

Reikningur úr rafrænu bókhaldskerfi skv. reglugerð 505/2013

0001936



Móttækid 16/05/2018

VSÓ RÁÐGJÖF

FRAMKV.SVIÐ RVK, USK, RÁÐHÚS
Þór Gunnarsson
BORGARBÓKHALD TJARNARGÖTU 11
101 REYKJAVÍK

Reikningur

Kennitala 6812720979
Vsk nr. 15519
Bankanr. [REDACTED]
Reikningsnúmer R1211290
Reikn.færir á viðskm. 570480-0149
Bókunardags. 30.4.2018
Gjaldddagi 20.5.2018

Verk nr. 18156


Viti við Sæbraut - Eftirlit/verkbeiðnanúmer 153144

Bóknun Skv. Meðfylgjandi Skilagrein

Samtals án VSK 328.700
VSK-upphæð 78.888
Samtals með VSK 407.588

Greiðsluupplýsingar:

6812720979> 0180101+ 03< 011566> 220518+



Þessi reikningur er upprunninn í bókhalds- og áætlunarkerfi sem er sniðið eftir reglugerð nr. 505/2013

VSÓ RÁÐGJÖF

Borgatún 20, 105 Reykjavík
Sími: 5859000, Fax: 5859010
Netfang: vso@vso.is
Heimasíða: www.vso.is

Vinsamlegast athugið, reikningar greiðist innan 20 daga frá dagsetningu reiknings.

Móttækia 16/05/2018

Yrki arkitektar ehf

Kt.: 560997-3109 Vsk-númer: 55547

REIKNINGUR

Reikningur nr. 0001935

Umhverfis- og skipulagssvið
Borgartúni 12-14

105 Reykjavík

Kt. 570480-0149

Vörumóttakandi
Umhverfis- og skipulagssvið
Borgartúni 12-14

105 Reykjavík

Viðskiptanúmer 5704800149
Dagsetning 30.04.2018

Gjaldldagi 30.04.2018
Eindagi 30.04.2018

Þjónusta	Magn	Ein.verð	Upphæð
Vinna ráðgjafa við aðaluppdrætti			
Þjónusta - Arkitekt 1	0,50	18.645	9.323
Þjónusta - Arkitekt 2	13,00	17.765	230.945
		Upphæð án vsk.	240.268
		Vsk. upphæð	57.664
		Samtals ISK með vsk.	297.932
MÓTTEKIÐ 15. maí 2018 Borgarbókhald			
Vinsamlega leggið inn á reikning Yrki arkitekta ehf. Landsbanki Íslands			
Sundurliðun vsk. upphæðar			
	VSK 24.0%	240.268	57.664

Reikningur úr rafrænu bókhaldskerfi skv. reglugerð 505/2013

0001935



Yrki arkitektar ehf

Kt.: 560997-3109 Vsk-númer: 55547

REIKNINGUR

Reikningur nr. 0002036

Umhverfis- og skipulagssvið
Borgartúni 12-14Vörumóttakandi
Umhverfis- og skipulagssvið
Borgartúni 12-14Viðskiptanúmer 5704800149
Dagsetning 31.07.2018

105 Reykjavík

105 Reykjavík

Gjaldddagi 31.07.2018
Eindagi 31.07.2018

Kt. 570480-0149

Þjónusta	Magn	Ein.verð	Upphæð
Vinna ráðgjafa á framkvæmdatíma			
Þjónusta - Arkitekt 1	15,00	18.645	279.675
Þjónusta - Arkitekt 2	15,00	17.765	266.475
Upphæð án vsk.			546.150
Vsk. upphæð			131.076
Samtals ISK með vsk.			677.226
MÓTTÆK 08. ágúst 2018 Reiknibókheim			
Vinsamlega leggið inn á reikning Yrki arkitekta ehf. Landsbanki Íslands			
Sundurliðun vsk. upphæðar			
VSK 24.0%		546.150	131.076

Reikningur úr rafrænu bókhaldskerfi skv. reglugerð 505/2013

0002036



Mottækið 16/03/2018

Yrki arkitektar ehf

Kt.: 560997-3109 Vsk-númer: 55547

REIKNINGUR

Reikningur nr. 0001864

Umhverfis- og skipulagssvið
Borgartúni 12-14

105 Reykjavík

Kt. 570480-0149

Vörumóttakandi
Umhverfis- og skipulagssvið
Borgartúni 12-14

105 Reykjavík

Viðskiptanúmer 5704800149
Dagsetning 28.02.2018

Gjaldldagi 28.02.2018
Eindagi 28.02.2018

Þjónusta	Magn	Ein.verð	Upphæð
Viti við Höfða - verkt.útb.gögn og fundir. Verknúmer 153143			
Þjónusta - Arkitekt 1	8,50	18.645	158.482
Þjónusta - Arkitekt 2	3,00	17.765	53.295
Þjónusta - Arkitekt 3	6,00	16.445	98.670
Upphæð án vsk.			310.448
Vsk. upphæð			74.507
Samtals ISK með vsk.			384.955
MOTTÆKIÐ 15. MAR 2018 Borgarbókhald			
Vinsamlega legglið inn á reikning Yrki arkitekta ehf. Landsbanki Íslands			
Sundurliðun vsk. upphæðar			
VSK 24.0%		310.448	74.507

Reikningur úr rafrænu bókhaldskerfi skv. reglugerð 505/2013

0001864



YRKI arkitektar ehf • Hverfisgata 76 • 101 Reykjavík • sími: 552-6629 • fax: 552-6649 • netfang: yrki@yrki.is • vefang: www.yrki.is

Móttækið 17/04/2018

REIKNINGUR 5676

Vegna / Umferðadeild, Sebraut - Katrínartún.



SPÍSSAR EHF

STÍFLUPJÓNUSTA

SÍMI: 511 2230 / 891 7230

spissar@simnet.is

Nafn:	Fræmkvæmdasu.	
Heimili:	Borgartúni 12-14	Póstnúmer: 105 Rvk
Kennit.: 570480-0149	Verk nr.:	153144

Banki: [REDACTED]

DAGS.: 10/4 20 18	TEXTI	EININGARVERÐ	UPPHÆÐ
Samkvæmt vinnuskýrslu			
20/3 Hreinsa brunna og	Dælubíll, DV 4 1/2	19.200.-	86.400.-
ídráttar rör á milli brunna,	Dælubíll, EV		
losun á tipp.	Eknir km 59	339.-	20.001.-
	Urðun í kg		
MÓTTEKIÐ 11. apríl 2018 Borgarbókhald		UPPHÆÐ ÁN VSK.	106.401.-
UMB.: Páll [REDACTED]		24% VSK.	25.536.-
		SAMTALS MEÐ VSK.	131.937.-

Hamarshöfði 9 • 110 Reykjavík • Kl. 660104-2830 • Vsknr. 81748
Póstfang: Brekkutangi 21 • 270 Mosfellsbær



Móttækid 01/11/2018

SUDURVERK

Reykjavíkurborg - Eignasjóður
Borgartúni 12-14
Umhverfis og skipulagssvið RVK
105 Reykjavík

Reikningur

Hlíðasmári 11 - 201 Kópavogur
Sími 5775700
sudurverk@sudurverk.is
www.sudurverk.is
Kt. 520885-0219
Bankareikningur [REDACTED]
Vsk.nr. 15848

Reikningsnúmer SR180123
Reikn. færast á viðskm. 5704800149
Bókunardags. 20.10.2018
Gjaldddagi 19.11.2018
Sölumaður

Verk nr. 2018-265


Reykjavíkurborg - Eignasjóður

Lýsing	Magn	Mæliein.	Ein.verð	Afsláttur	Upphæð
Framvinda#3	1		766.312,00		766.312

Verkbeiðnanúmer 153144

Samtals án VSK 766.312
VSK-upphæð 183.915
Samtals með VSK 950.227

VSK %	VSK-stofn	VSK-upphæð
24,00	766.312	183.915



Sampylur 26.10.2018
VSÓ RÁÐGJÖF
Isberg K Ingólysson



Reykjavíkurborg - Eignasjóður
Borgartúni 12-14
Umhverfis og skipulagssvið RVK
105 Reykjavík

Reikningur

Hlíðasmári 11 - 201 Kópavogur
Sími 5775700
sudurverk@sudurverk.is
www.sudurverk.is
Kt. 520885-0219
Bankareikningur [REDACTED]
Vsk.nr. 15848

Reikningsnúmer SR180041
Reikn.færir á viðskm. 5704800149
Bókunardags. 28.3.2018
Gjaldddagi 27.4.2018
Sölumaður

Verk nr.	2018-265	Reykjavíkurborg - Eignasjóður					
Lýsing		Magn	Mæliein.	Ein.verð	Afsláttur	Upphæð	
Framvinda #1, sjá meðf. skjal		1		11.997.265,00		11.997.265	
Viti við Sæbraut							
Verkeiðanúmer 153144							
Samtals án VSK						11.997.265	
VSK-upphæð						2.879.344	
Samtals með VSK						14.876.609	
VSK %		VSK-stofn		VSK-upphæð			
24,00		11.997.265		2.879.344			

MÓTTÆKIÐ
23. apríl 2018
Borgarbókhald

Samþykkt 16.04.2018
VSÓ RAGGJAF
Ásbjörg K. Ingólfsson

24.05.2018

**SUÐURVERK**

Móttækid 28/05/2018


Reykjavíkurborg - Eignasjóður
 Borgartúni 12-14
 /Mhverfis og skipulagssvið RVK
 105 Reykjavík

Reikningur

Hlíðasmári 11 - 201 Kópavogur
 Sími 5775700
 sudurverk@sudurverk.is
 www.sudurverk.is
 Kt. 520885-0219
 Bankareikningur [REDACTED]
 Vsk.nr. 15848

Reikningsnúmer SR180054
 Reikn.færirst á viðskm. 5704800149
 Bókunardags. 30.4.2018
 Gjaldddagi 30.5.2018
 Sölumaður

Verk nr.	2018-265	Reykjavíkurborg - Eignasjóður					
Lýsing		Magn	Mæliein.	Ein.verð	Afsláttur	Upphæð	
Framvinda#2		1		17.539.472,00		17.539.472	
Verkbeiðnanúmer 153144							
				Samtals án VSK		17.539.472	
				VSK-upphæð		4.209.473	
				Samtals með VSK		21.748.945	
	VSK %	VSK-stofn		VSK-upphæð			
	24,00	17.539.472		4.209.473			



Skráðgengi 2018.2018
 VSK RAGGI
 Ísborg V. Ingólfsson

Yrki arkitektar ehf

Kt.: 560997-3109 Vsk-númer: 55547

REIKNINGUR

Reikningur nr. 0001919

Umhverfis- og skipulagssvið
Borgartúni 12-14

105 Reykjavík

Vörumóttakandi
Umhverfis- og skipulagssvið
Borgartúni 12-14

105 Reykjavík

Viðskiptanúmer 5704800149
Dagsetning 31.03.2018Gjaldtagi 31.03.2018
Eindagi 31.03.2018

Kt. 570480-0149

Þjónusta	Magn	Ein.verð	Upphæð
Vinna ráðgjafa við aðaluppdrætti			
Þjónusta - Arkitekt 1	19,00	18.645	354.255
Þjónusta - Arkitekt 2	138,00	17.765	2.451.570
Þjónusta - Arkitekt 3	33,00	16.445	542.685
Upphæð án vsk.			3.348.510
Vsk. upphæð			803.642
Samtals ISK með vsk.			4.152.152
MÓTTEKID 12. maí 2018 Reikningur			
Vinsamlega leggið inn á reikning Yrki arkitekta ehf. Landsbanki Íslands			
Sundurliðun vsk. upphæðar			
VSK 24.0%		3.348.510	803.642

Reikningur úr rafrænu bókhaldskerfi skv. reglugerð 505/2013

0001919



Yrki arkitektar ehf

Kt.: 560997-3109 Vsk-númer: 55547

REIKNINGUR

Reikningur nr. 0001912

Umhverfis- og skipulagssvið
Borgartúni 12-14Vörumóttakandi
Umhverfis- og skipulagssvið
Borgartúni 12-14Viðskiptanúmer 5704800149
Dagsetning 31.03.2018

105 Reykjavík

105 Reykjavík

Gjaldlagi 31.03.2018
Eindagi 31.03.2018

Kt. 570480-0149

Þjónusta	Magn	Eln.verð	Upphæð
Vinna ráðgjafa við verkeikningar í mars 2018 og hönnunarfundir			
Þjónusta - Arkitekt 1	10,50	18.645	195.773
Þjónusta - Arkitekt 2	6,50	17.765	115.473
		Upphæð án vsk.	311.245
		Vsk. upphæð	74.699
		Samtals ISK með vsk.	385.944
MÓTTEKIÐ 12. maí 2018 Borgarbókhald			
Vinsamlega leggið inn á reikning Yrki arkitekta ehf. Landsbanki Íslands			
Sundurliðun vsk. upphæðar			
	VSK 24.0%	311.245	74.699

Reikningur úr rafrænu bókhaldskerfi skv. reglugerð 505/2013

0001912



Yrki arkitektar ehf

Kt.: 560997-3109 Vsk-númer: 55547

REIKNINGUR

Reikningur nr. 0002089

Umhverfis- og skipulagssvið
Borgartúni 12-14Vörumóttakandi
Umhverfis- og skipulagssvið
Borgartúni 12-14

105 Reykjavík

105 Reykjavík

Viðskiptanúmer 5704800149
Dagsetning 30.09.2018Gjaldldagi 30.09.2018
Eindagi 30.09.2018

Kt. 570480-0149

153143

Þjónusta	Magn	Ein.verð	Upphæð
Vinna ráðgjafa á framkvæmdatíma við vita við Höfða			
Þjónusta - Arkitekt 1	6,50	18.645	121.193
Þjónusta - Arkitekt 2	1,00	17.765	17.765
		Upphæð án vsk.	138.958
		Vsk. upphæð	33.350
		Samtals ISK með vsk.	172.308
MÓTTEKID 11. okt. 2018 Borgarbókhald			
Vinsamlega leggið inn á reikning Yrki arkitekta ehf. Landsbanki Íslands			
Sundurliðun vsk. upphæðar			
	VSK 24.0%	138.958	33.350

Reikningur úr rafrænu bókhaldskerfi skv. reglugerð SOS/2013

0002089



Móttækid 16/07/2018

Yrki arkitektar ehf

Kt.: 560997-3109 Vsk-númer: 55547

REIKNINGUR

Reikningur nr. 0001990

Umhverfis- og skipulagssvið
Borgartúni 12-14

105 Reykjavík

Kt. 570480-0149

Vörumóttakandi
Umhverfis- og skipulagssvið
Borgartúni 12-14

105 Reykjavík

Viðskiptanúmer 5704800149
Dagsetning 30.06.2018

Gjaldddagi 30.06.2018
Eindagi 30.06.2018

Þjónusta	Magn	Ein.verð	Upphæð
Vinna ráðgjafa við uppfærslu á aðaluppdráttum			
Þjónusta - Arkitekt 1	9,50	18.645	177.127
Þjónusta - Arkitekt 2	75,00	17.765	1.332.375
Upphæð án vsk.			1.509.502
Vsk. upphæð			362.281
Samtals ISK með vsk.			1.871.783
Sundurliðun vsk. upphæðar			
VSK 24.0%		1.509.502	362.281

Vinsamlega leggið inn á reikning Yrki arkitekta ehf.
Landsbanki Íslands

Reikningur úr rafrænu bókhaldskerfi skv. reglugerð 505/2013

0001990



Yrki arkitektar ehf

Kt.: 560997-3109 Vsk-númer: 55547

REIKNINGUR

Reikningur nr. 0002000

Umhverfis- og skipulagssvið
Borgartúni 12-14

105 Reykjavík

Kt. 570480-0149

Vörumóttakandi
Umhverfis- og skipulagssvið
Borgartúni 12-14

105 Reykjavík

Viðskiptanúmer 5704800149
Dagsetning 30.06.2018Gjalddagi 30.06.2018
Eindagi 30.06.2018

Þjónusta	Magn	Ein.verð	Upphæð
Vinna ráðgjafa við verkeikningar, verklýsingar, magntölur og fl.			
Þjónusta - Arkitekt 1	39,00	18.645	727.155
Þjónusta - Arkitekt 2	0,50	17.765	8.882
		Upphæð án vsk.	736.037
		Vsk. upphæð	176.649
		Samtals ISK með vsk.	912.686
Vinsamlega leggið inn á reikning Yrki arkitekta ehf.			
Landsbanki Íslands			
Sundurliðun vsk. upphæðar			
	VSK 24.0%	736.037	176.649

Reikningur úr rafrænu bókhaldskerfi skv. reglugerð 505/2013

0002000

Móttækid 18/07/2018



SUDURVERK

Reykjavíkurborg - Eignasjóður
Borgartúni 12-14
Umhverfis og skipulagssvið RVK
105 Reykjavík

Reikningur

Hlíðasmári 11 - 201 Kópavogur
Sími 5775700
sudurverk@sudurverk.is
www.sudurverk.is
Kt. 520885-0219
Bankareikningur [REDACTED]
Vsk.nr. 15848


Reikningsnúmer SR180080
Reikn.færirst á viðskm. 5704800149
Bókunardags. 13.7.2018
Gjaldlagi 12.8.2018
Sölumaður

Verk nr. 2018-265 Reykjavíkurborg - Eignasjóður

Lýsing	Magn	Mæliein.	Ein.verð	Afsláttur	Upphæð
Viðbótarverk, niðurrekstur staura	1		5.531.960,00		5.531.960

Samtals án VSK	5.531.960
VSK-upphæð	1.327.670
Samtals með VSK	6.859.630

VSK %	VSK-stofn	VSK-upphæð
24,00	5.531.960	1.327.670



Yrki arkitektar ehf

Kt.: 560997-3109 Vsk-númer: 55547

REIKNINGUR

Reikningur nr. 0002027

Umhverfis- og skipulagssvið
Borgartúni 12-14

105 Reykjavík

Kt. 570480-0149

Vörumóttakandi
Umhverfis- og skipulagssvið
Borgartúni 12-14

105 Reykjavík

Viðskiptanúmer 5704800149
Dagsetning 06.07.2018Gjaldddagi 06.07.2018
Eindagi 06.07.2018

Þjónusta	Magn	Ein.verð	Upphæð
Pixel reikningur 105225			
Útlagður kostnaður með vsk.	1,00	57.664	57.664
		Upphæð án vsk.	57.664
		Vsk. upphæð	13.839
		Samtals ISK með vsk.	71.503
MÓTTEKIÐ 25. júlí 2018 Borgarbókhald			
Vinsamlega leggið inn á reikning Yrki arkitekta ehf. Landsbanki Íslands			
Sundurliðun vsk. upphæðar			
	VSK 24.0%	57.664	13.839

Reikningur úr rafrænu bókhaldskerfi skv. reglugerð 505/2013

0002027



VSÓ RÁÐGJAF

FRAMKV. OG EIGNASVIÐ/EIGNASJÓÐ RVK, USK,

Þór Gunnarsson
Borgartún 12-14
105 ReykjavíkVerk nr. 18156
Þóknun Skv. Meðfylgjandi Skilagrein

Vilti við Sæbraut - Eftirlit/verkbnr 153144


Greiðsluupplýsingar:

6812720979> 0180531+ 03< 011566> 310718+

Reikningur

Kennitala	6812720979
Vsk nr.	15519
Banknr.	
Reikningsnúmer	R1211718
Reikn.færist á viðskm.	570480-0149
Bókunardags.	31.7.2018
Gjaldldagi	29.9.2018

Samtals án VSK	1.171.450
VSK-upphæð	281.148
Samtals með VSK	1.452.598



Þessi reikningur er upprunninn í bókhalds- og áætlunarkerfi sem er sniðið eftir reglugerð nr. 505/2013

VSÓ RÁÐGJAF

Borgartún 20, 105 Reykjavík
Sími: 5859000, Fax: 5859010
Netfang: vso@vso.is
Heimasíða: www.vso.is

Vinsamlegast athugið, reikningar greiðist innan 20 daga frá dagsetningu reiknings.

Reikningur

FRAMKV. OG EIGNASVIÐ/EIGNASJÓÐ RVK, USK,

Þór Gunnarsson
Borgartún 12-14
105 Reykjavík

Kennitala 6812720979


Vsk nr. 15519
Bankanr. [REDACTED]Reikningsnúmer R1212106
Reikn.færisk á viðskm. 570480-0149
Bókunardags. 30.9.2018
Gjaldddagi 29.11.2018

Verk nr. 18156

Viti við Sæbraut - Eftirlit/verkbnr 153144

Póknun Skv. Meðfylgjandi Skilagrein

Samtals án VSK	1.532.500
VSK-upphæð	367.800
Samtals með VSK	1.900.300



Þessi reikningur er upprunninn í bókhalds- og áætlunarkerfi sem er sniðið eftir reglugerð nr. 505/2013

Móttakandi:

Reykjavíkurborg - eignasjóður
Borgartúni 10-12
105 REYKJAVÍK
Kt: 570480-0149
Skammv. : VANTAR

Seljandi:

Ráðhús Reykjavíkur -
Fjármálasvið
Tjarnargötu 11
101 REYKJAVÍK
Kt: 530269-7609
Vsk.nr. : 19009

Rafrænn innri reikningur

14261-Innsiglingarviti við Sæbraut. Útsýnispallur

Dagsetning: 02.07.2018
Reikningsnúmer: 89819709
Pöntun númer: 48744460
Sölumaður: Guðbjörg Eggertsdóttir
Tilvísun: Útboðsauglýsing
Pantað af: Þór Gunnarsson

Vara	Lýsing	Eining	Magn	Verð	Afsl. %	Upphæð
R-AUGL	Auglýsingar	EIN	1.00	16.984,00	0,00	16.984,00
	Birt í Fbl. 12.5.2018					
R-AUGL	Auglýsingar	EIN	1.00	5.643,00	0,00	5.643,00
	Birt í Mbl. 12.5.2018					
	Útboð nr. 14261 Innsiglingarviti við Sæbraut					
	Þór Gunnarsson					
	Verkbeiðnanúmer: 153144					

Samtals án vsk 22.627,00
VSK 0,00
Samtals 22.627,00

Á innri reikningi/áskrift er tillaga að bókunarstreng sem byggir á upplýsingum úr stofnskrá viðskiptavinar, vöruflokki vöru eða áskrift. Samþykkjendur þurfa að yfirfara bókunarstrenginn í samþykktarferlinu. Ef bókunarstrengur er rangur þarf að senda hann í leiðréttingu og fer hann þá til bóka sem gerir viðeigandi breytingu. Ef reikningur á ekki rétt á sér eða er efnislega rangur, þarf eftir atvikum, að óska eftir leiðréttingu, þ.e. kredit reikningi frá þeim sem er ábyrgur fyrir sölureikningi. Þegar leiðrétting kemur til samþykktar þá er hún afgreidd ásamt upprunalega reikningnum.

Reikningur þessi á uppruna sinn í rafrænu bókhaldi skv. reglugerð nr. 598/1999

Móttakandi:

Reykjavíkurborg - eignasjóður
Borgartúni 10-12
105 REYKJAVÍK
Kt: 570480-0149
Skammv. : VANTAR

Seljandi:

Byggingarfulltrúinn í Reykjavík
Borgartún 12-14
105 REYKJAVÍK
Kt: 530269-7609
Vsk.nr. : 19009

Rafrænn innri reikningur

Dagsetning: 24.04.2018
Reikningsnúmer: 89763219
Pöntun númer: 31469566
Sölumaður: Þjónustuver Höfðatorgi -
Tilvísun: BN054463
Pantað af:

Vara	Lýsing	Eining	Magn	Verð	Afsl. %	Upphæð
ERINDREK	Lokaúttekt, Erindi :BN054463 Sæbraut 91 Bygging vita, útsýnispallur tröppur og skábraut	EIN	1.00	22.000,00	0,00	22.000,00
ERINDREK	Áfangaúttektir, Erindi :BN054463 5 x 11.000 kr/útt.	EIN	1.00	55.000,00	0,00	55.000,00
ERINDREK	Vottorð um lokaúttekt, Erindi :BN054463	EIN	1.00	19.500,00	0,00	19.500,00
ERINDREK	Yfirferð sérteikninga, Erindi :BN054463	EIN	1.00	115.500,00	0,00	115.500,00

Samtals án vsk 212.000,00
VSK 0,00
Samtals 212.000,00

Á innri reikningi/áskrift er tillaga að bókunarstreng sem byggir á upplýsingum úr stofnskrá viðskiptavinar, vöruflokki vöru eða áskrift. Samþykkjendur þurfa að yfirfara bókunarstrenginn í samþykktarferlinu. Ef bókunarstrengur er rangur þarf að senda hann í leiðréttingu og fer hann þá til bókara sem gerir viðeigandi breytingu. Ef reikningur á ekki rétt á sér eða er efnislega rangur, þarf eftir atvikum, að óska eftir leiðréttingu, þ.e. kredit reikningi frá þeim sem er ábyrgur fyrir sölureikningi. Þegar leiðrétting kemur til samþykktar þá er hún afgreidd ásamt upprunalega reikningnum.

Reikningur þessi á uppruna sinn í rafrænu bókhaldi skv. reglugerð nr. 598/1999

Móttakandi:

Reykjavíkurborg - eignasjóður
Borgartúni 10-12
105 REYKJAVÍK
Kt: 570480-0149
Skammv. : VANTAR

Seljandi:

Skipulagsfulltrúi
Borgartún 12-14
105 REYKJAVÍK
Kt: 530269-7609
Vsk.nr. : 19009

Rafrænn innri reikningur

Dagsetning: 20.02.2018
Reikningsnúmer: 89713054
Pöntun númer: 31443832
Sölumaður: Ann María Andreassen
Tilvisun: SN180096-Sæbraut
innsiglingarviti
Pantað af: magnús.ingi.erlingsson@re

Vara	Lýsing	Eining	Magn	Verð	Afsl. %	Upphæð
U-5.2 FRAMKVÆMD	Framkvæmdaleyfi 5.2 skv. 13. gr skipulagslaga Verkbeiðni nr. 153144	EIN	1.00	126.000,00	0,00	126.000,00

Samtals án vsk	126.000,00
VSK	0,00
Samtals	126.000,00

Á innri reikningi/áskrift er tillaga að bókunarstreng sem byggir á upplýsingum úr stofnskrá viðskiptavinar, vöruflokki vöru eða áskrift. Samþykkjendur þurfa að yfirfara bókunarstrenginn í samþykktarferlinu. Ef bókunarstrengur er rangur þarf að senda hann í leiðréttingu og fer hann þá til bóka sem gerir viðeigandi breytingu. Ef reikningur á ekki rétt á sér eða er efnislega rangur, þarf eftir atvikum, að óska eftir leiðréttingu, þ.e. kredit reikningi frá þeim sem er ábyrgur fyrir sölu-reikningi. Þegar leiðrétting kemur til samþykktar þá er hún afgreidd ásamt upprunalega reikningnum.

Reikningur þessi á uppruna sinn í rafrænu bókhaldi skv. reglugerð nr. 598/1999

Yrki arkitektar ehf

Kt.: 560997-3109 Vsk-númer: 55547

REIKNINGUR

Reikningur nr. 0002066

Umhverfis- og skipulagssvið
Borgartúni 12-14

105 Reykjavík

Kt. 570480-0149

Vörumóttakandi
Umhverfis- og skipulagssvið
Borgartúni 12-14

105 Reykjavík

Viðskiptanúmer 5704800149
Dagsetning 31.08.2018Gjalddagi 31.08.2018
Eindagi 31.08.2018

Þjónusta	Magn	Ein.verð	Upphæð
Vinna ráðgjafa við framkvæmd vegna vitans við Höfða			
Þjónusta - Arkitekt 1	13,00	18.645	242.385
Þjónusta - Arkitekt 2	19,50	17.765	346.418
		Upphæð án vsk.	588.802
		Vsk. upphæð	141.313
		Samtals ISK með vsk.	730.115
Sundurliðun vsk. upphæðar			
	VSK 24.0%	588.802	141.313

MÓTTEKIÐ
Ú 7. sep. 2018
BorgarbókhaldVinsamlega leggið inn á reikning Yrki arkitekta ehf.
Landsbanki Íslands

Reikningur úr rafrænu bókhaldskerfi skv. reglugerð 505/2013

0002066



Spöng ehf

Furulundi 9

210 Garðabæ

Kt.: 550896-2149 Vsk-númer: 51458 Sími: 540-9347

REIKNINGURReykjavíkurborg
Borgartúni 12-14

105 Reykjavík

Kt. 570480-0149

Reikningur nr. 0000172

Viðskiptanúmer 5704800149
Dagsetning 18.09.2018Eindagi 28.09.2018
Sölumaður SKH

Vörunr.	Vöruheiti	Magn	Ein.verð	Upphæð
---------	-----------	------	----------	--------

Innsiglingarviti við Sæbraut - Útsýnispallur, tröppur og skábraut

Verkbáttanúmer 153144

Framvindureikningur nr.2 samkvæmt fylgiskjali.

v-140	Viti - Sæbraut 91	1,00	11.662.177	11.662.177
-------	-------------------	------	------------	------------

Upphæð án vsk. 11.662.177

Vsk. upphæð 2.798.923

Samtals ISK með vsk. 14.461.100

MÓTTEKIÐ

24. sep. 2018

Borgarbókhald

Samþykkt 19.09.2018
VSORÁÐGIÖF
Jónberg V. Ingólfsson

Vinsamlega leggið inn í banka: [REDACTED]

Sundurliðun vsk. upphæðar

VSK 24.0% 11.662.177 2.798.923

Móttekið 21/08/2018

Spöng ehf

Furulundi 9

210 Garðabæ

Kt.: 550896-2149 Vsk-númer: 51458 Sími: 540-9347

REIKNINGUR

Reykjavíkurborg
Borgartúni 12-14

105 Reykjavík

Kt. 570480-0149

Reikningur nr. 0000163

Viðskiptanúmer 5704800149
Dagsetning 14.08.2018

Eindagi 24.08.2018
Sölumaður SKH

Vörunr.	Vöruheiti	Magn	Ein.verð	Upphæð
Innsiglingarviti við Sæbraut 91 - Útsýnispallur, tröppur og skábraut Verkþáttanúmer 153144 Framvindureikningur nr.1 samkvæmt fylgiskjali.				
v-140	Viti - Sæbraut 91	1,00	8.191.774	8.191.774
Upphæð án vsk.				8.191.774
Vsk. upphæð				1.966.026
Samtals ISK með vsk.				10.157.800

MÓTTEKIÐ
20. aug. 2018
Borgarbókhald

Vinsamlega leggið inn í banka:

Sampylent 16.08.2018
VSÓ RÁÐGJÖF
Jóhanna V. Ingólfsson

Sundurliðun vsk. upphæðar

VSK 24.0% 8.191.774 1.966.026

Reikningur úr rafrænu bókhaldskerfi skv. reglugerð 505/2013

0000163

AFM
